

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2022 年第 3 期，总第 48 期）

丽水市水利局办公室编

2022-4-11

2022 年 1-3 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况


2022 年全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-3 月完成投资 12.7 亿元，占年度计划的 25.4%，达到时序要求，较 2021 年一季度（6.5 亿元）增长 95%。

从完成率看，莲都区、青田县、庆元县、缙云县、遂昌县和景宁县均超时序要求，其中青田县和景宁县完成率超时序 10 个百分点；松阳县完成率最低，仅 10.2%。从投资量看，缙云县和青田县投资量最大，分别占全市总投资量的 19.8%和 16.7%；莲都区投资量最低，仅 0.43 亿元。

丽水市 2022 年度水利建设投资进度表（1-3 月）

单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	1.21	16.8%
莲都区	1.4	0.43	30.7%
龙泉市	3.2	0.62	19.5%
青田县	5.8	2.12	36.5%
云和县	3.4	0.58	17.2%
庆元县	6.6	1.81	27.4%
缙云县	8.3	2.51	30.3%
遂昌县	4.3	1.43	33.3%
松阳县	6.1	0.62	10.2%
景宁县	3.6	1.33	36.9%
合计	50	12.67	25.4%

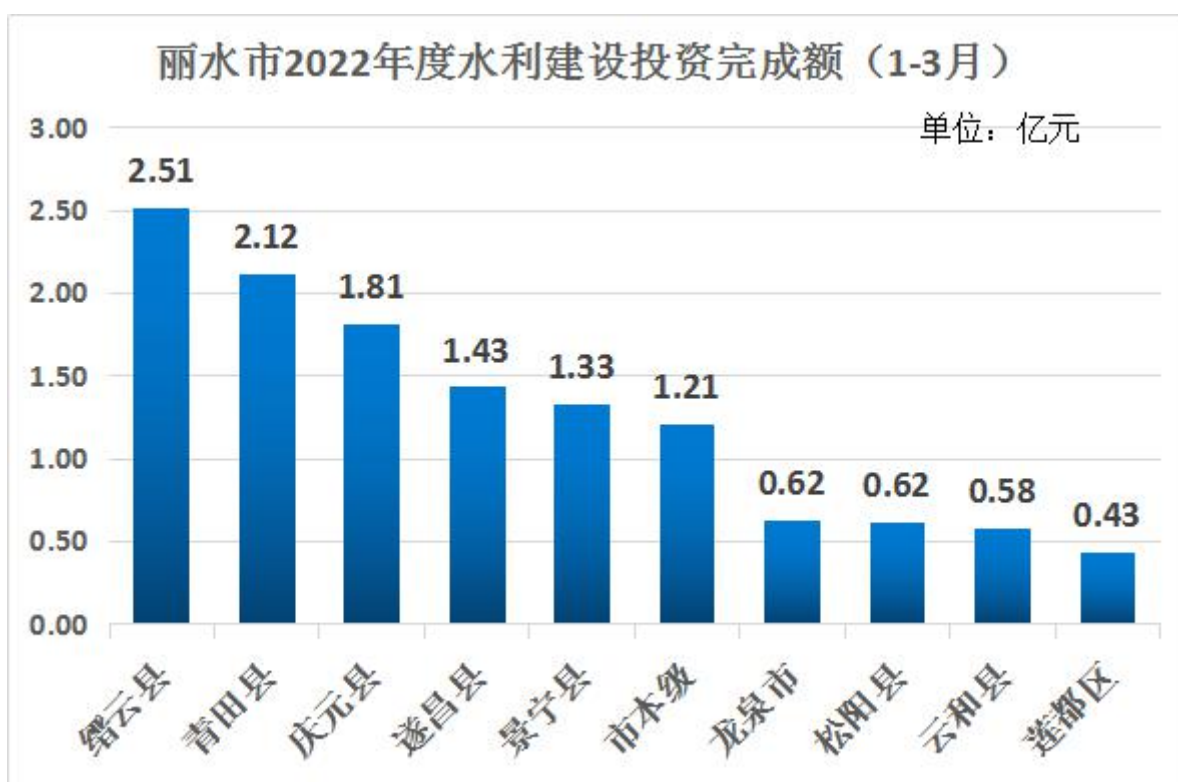



二、水利重大项目计划执行情况

2022年，全市计划实施30.3亿元，共22个重大水利建设项目，1-3月完成投资7.2亿元，占年度计划的23.76%，各项目基本按原计划实施。

今年新开工6项，其中列入省级新开工的4项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松古平原水系综合治理工程已按要求于一季度开工建设，大溪治理提升改造工程和青田县中西部引水工程计划6月底开工，此外，杨楼溪水库及供水工程和湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程争取年底开工建设，目前总体进度符合要求。

丽水市 2022 年 1-3 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022 年投资计划	完成投资额	完成率
合计			1815395	302995	71981	23.76%
1	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	1055	3.52%
2		丽水市滩坑引水工程	70505	15000	3773	25.15%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	10000	6336	63.36%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	200	4.00%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	1618	32.36%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	2110	30.14%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	10165	25.41%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	0	0.00%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	39	0.39%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	2300	53.49%
11	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	40000	7000	17.50%
12		庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	1900	47.50%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	0	0	0.00%
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	14960	29.92%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	4493	29.95%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1000	600	60.00%
17		湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	57000	1000	0	0.00%
18	松阳县	松阳县松阴河流域河流综合治理项目（干流）	25054	1000	200	20.00%
19		松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	3000	8.57%
20	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2695	1822	67.61%
21		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	2410	40.17%
22		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	8000	42.11%

2022年，全市开展10个重大水利项目前期工作（其中5个为省重大前期），目前各项目进展较为顺利，龙泉市均溪三级水库改建工程今年完成难度较大。

丽水市2022年1-3月水利重大前期工作进度表

单位：万元

序号	工程名称	总投资	年度任务	2022年责任目标计划	目前进展
				第一季度	
1	莲湖水库*	790000	完成可研编制	开展项目建议书受理	获得项建赋码，项目建议书上报省发改委
2	紧水滩至滩坑水资源调配工程	500000	完成项建编制	项建招标准备	项建招标准备
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	可研编制	可研编制
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	开展项建编制	项建编制
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	完成规模论证报告	完成规模论证初稿
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	公路专项方案设计、实物调查大纲编制	公路专项方案设计编制完成、实物调查大纲编制完成
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成可研审查	完成项目建议书受理	完成项目建议书送审
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	完成项建-可研勘察设计委托	已完成项目建议书初稿编制，正在进行可行性研究报告编制和可研阶段地勘
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	开展选址及规模论证专题委托	正在准备选址及规模论证前期工作
10	浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）	6000	项目开工建设，力争完成提升改造3公里	2022年3月底前完成概念性方案设计并提交方案文本	完成方案设计


注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况


截止目前，全市共争取9812万元中央资金（不含山水项目中央专项资金），主要实施中小河流治理、中型灌区续建配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护等

项目。截止3月底，21个共完成投资5051万元，其中完成中央投资2124万元，地方投资2927万元，完成率分别为21.6%和20.6%。

2022年各县（市、区）争取中央资金情况

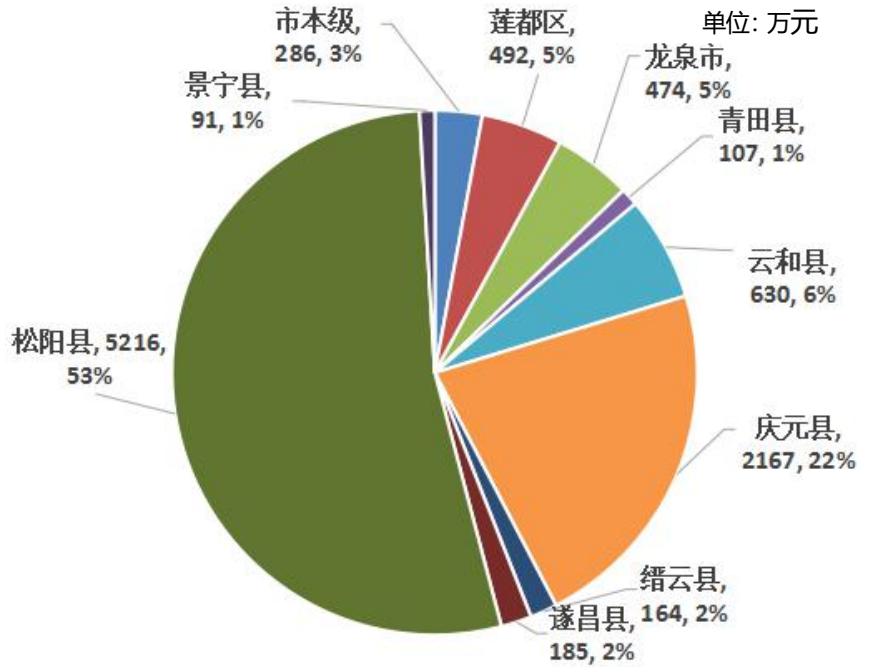

1-3月中央和总投资完成情况表

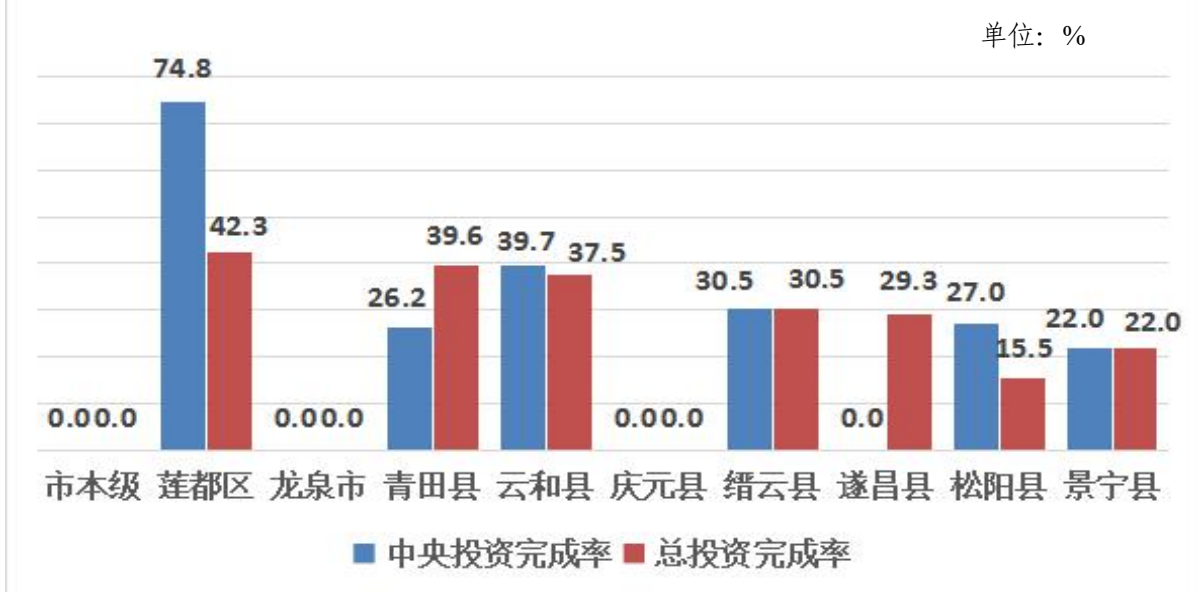

丽水市 2022 年 1-3 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元


分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总 计	9812	24008	2124	5051	21.6%	21.0%
莲都区		492	989	368	418	74.8%	42.3%
	2022 年莲都区宣平流域综合治理工程	368	865	368	418	100.0%	48.3%
	莲都区 2022 年小型水库工程设施维修养护	124	124	0	0	0.0%	0.0%
青田县		107	139	28	55	26.2%	39.6%
	2022 年青田县小型水库工程设施维修养护	107	139	28	55	26.2%	39.6%
缙云县		164	164	50	50	30.5%	30.5%
	缙云县 2022 年小型水库工程设施维修养护	164	164	50	50	30.5%	30.5%
遂昌县		185	5637	0	1650	0.0%	29.3%
	遂昌县 2022 年中小流域综合治理项目	89	5500	0	1650	0.0%	30.0%
	遂昌县 2022 年小型水库工程设施维修养护工程	96	137	0	0	0.0%	0.0%
松阳县		5216	10370	1408	1608	27.0%	15.5%
	2022 年度松阳县松古平原水系综合治理	350	700	0	0	0.0%	0.0%
	2022 年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600	800	388	388	64.7%	48.5%
	2022 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383	4583	100	300	4.2%	6.5%
	2022 年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766	4150	900	900	51.0%	21.7%
	2022 年度松阳县小型水库维修养护工程	117	137	20	20	17.1%	14.6%

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		630	3330	250	1250	39.7%	37.5%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139	1639	100	600	71.9%	36.6%
	2022年云和县云坛流域综合治理工程	400	1600	150	650	37.5%	40.6%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91	91	0	0	0.0%	0.0%
庆元县		2167	2167	0	0	0.0%	0.0%
	2022年庆元县松源流域综合治理工程	1887	1887	0	0	0.0%	0.0%
	2022年庆元县节水型社会	190	190	0	0	0.0%	0.0%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90	90	0	0	0.0%	0.0%
景宁县		91	91	20	20	22.0%	22.0%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91	91	20	20	22.0%	22.0%
龙泉市		474	474	0	0	0.0%	0.0%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379	379	0	0	0.0%	0.0%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95	95	0	0	0.0%	0.0%
丽水市直属		286	646.76	0	0	0.0%	0.0%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286	646.76	0	0	0.0%	0.0%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，总投资13.24亿元，其中中央资金6亿元。

2022年各县（市、区）瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化项目中央资金情况

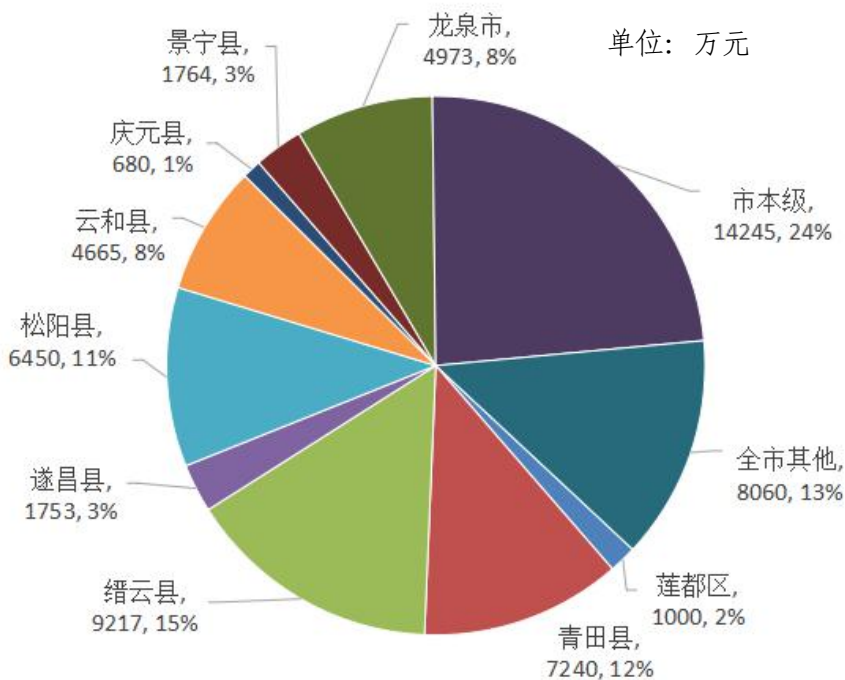

1-3月，完成投资1.98亿元，其中完成中央资金0.3亿元，完成率分别为14.9%和5.0%。缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、松阳县松阴河流域水生态保护修复项目（一期）、四都流域农田生态修复和提升工程、云和县浮云河流域综合治理工程、庆元县毛垟流域综合治理工程、龙泉市八都流域八都镇下游段综合治理工程、龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程和全市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造，目前处于项目前期状态，需加快前期进度，尽快开工。

丽水市 2022 年 1-3 月瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化 保护与修复工程（水利）完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022 年计划投资		1-3 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	132444	60047	19752	14.9%	2968	5.0%
莲都区		2000	1000	200	10.00%	0	0.0%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	200	10.00%	0	0.0%
青田县		13760	7240	3030	22.0%	500	7%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	2100	23.33%	0	0.0%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	150	8.52%	0	0.0%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	780	26.0%	500	41.7%
缙云县		22958	9217	1594	6.94%	0	0.0%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	0	0.00%	0	0.00%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	300	7.5%	0	0.00%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	1294	6.88%	0	0.00%
遂昌县		3500	1753	350	10.00%	0	0.0%
	遂昌县松阴河流域综合治理工程（一期）	3500	1753	350	10.0%	0	0.0%
松阳县		13760	6450	0	0.00%	0	0.0%
	松阳县松阴河流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	0	0.00%	0	0.0%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	0	0.0%	0	0
云和县		10017	4665	2339	23.35%	500	10.7%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	2300	38.23%	500	11.4%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	39	1.0%	0	0.0%
庆元县		1200	680	0	0.00%	0	0.0%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	0	0.00%	0	0.0%
景宁县		4500	1764	2550	56.7%	400	22.7%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	2550	56.67%	400	22.7%

分类	工程名称	2022 年计划投资			1-3 月完成投资		
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	1998	19.73%	1298	26.1%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	2480	1435	745	30.0%	505	30.0%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	1643	1206	493	30.01%	493	30.0%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	2535	1096	760	29.98%	300	27.4%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	0	0.0%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	0	0.00%	0	0.0%
市本级		41623	14245	7391	17.76%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	6336	38.1%	0	/
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	1055	4.22%	0	0.0%
其他县		9000	8060	300	3.33%	0	0.0%
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	9000	8060	300	3.3%	0	0.0%

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：周映辰

丽水市水利局

2022 年 4 月 11 日印发
