

# 丽水市水利局简报

## （水利建设投资）

（2022 年第 5 期，总第 50 期）

丽水市水利局办公室编

2022-6-7

### 2022 年 1-5 月全市水利计划执行情况

#### 一、水利投资总体完成情况

2022 年，全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-5 月完成投资 19.47 亿元，占年度计划的 39.0%，与时序要求相差约 3 个百分点。

从完成率看，青田县、莲都区、缙云县、遂昌县均达到时序要求，其中青田县完成率最高，已达到 63.4%，松阳县完成率最低，仅 20.3%。从投资量看，缙云县和青田县完成投资量最大，分别为 4.14 亿元和 3.68 亿元，占全市总投资量的 21.4%和 19.1%；云和县和莲都区完成投资量低于 1 亿元，其中莲都区最低，仅 0.74 亿元。

### 丽水市 2022 年度水利建设投资进度表（1-5 月）

单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	2.13	29.6%
莲都区	1.4	0.74	52.9%
龙泉市	3.2	1.00	31.3%
青田县	5.8	3.68	63.4%
云和县	3.4	0.88	25.9%
庆元县	6.6	1.91	28.9%
缙云县	8.3	4.14	49.9%
遂昌县	4.3	2.14	49.8%
松阳县	6.1	1.24	20.3%
景宁县	3.6	1.61	44.8%
合 计	50	19.47	39.0%





## 二、水利重大项目计划执行情况

2022年，全市计划投资30.3亿元，共开展22个重大水利建设项目，5月完成投资10.87亿元，占年度计划的35.87%，与时序相差约5.7个百分点，各项目基本按原计划实施。

今年新开工6项，其中列入省级新开工的4项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松阳县松古平原水系综合治理工程已于一季度开工建设，青田县中部、西部引水工程预计二季度开工，大溪治理提升改造工程开工难度大，预计三季度开工。此外，庆元县杨楼溪水库及供水工程和湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程力争年底开工。

## 丽水市 2022 年 1-5 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022 年投资计划	完成投资额	完成率
<b>合计</b>			<b>1815395</b>	<b>302995</b>	<b>108699</b>	<b>35.87%</b>
1	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	1910	6.37%
2		丽水市滩坑引水工程	70505	15000	6665	44.43%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	10000	10965	109.65%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	800	16.00%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	2828	56.56%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	3310	47.29%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	16440	41.10%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	0	0.00%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	39	0.39%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	2800	65.12%
11	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	40000	7000	17.50%
12		庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	2550	63.75%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	0	0	0.00%
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	24020	48.04%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	7212	48.08%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1000	800	80.00%
17		湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	57000	1000	0	0.00%
18	松阳县	松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流）	25054	1000	500	50.00%
19		松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	5800	16.57%
20	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2695	1890	70.13%
21		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	3370	56.17%
22		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	9800	51.58%

2022年，全市开展12个重大水利项目前期工作（其中5个为省重大前期）。5月，莲湖水库完成项目建议书批复，此外，新八源水库、成屏二级水库扩容等多个项目也完成项目建议书受理。

### 丽水市2022年1-5月水利重大前期工作进度表


单位：万元

序号	工程名称	总投资	年度任务	目前进展
1	莲湖水库*	790000	完成可研编制	完成项建批复
2	浙西南两库连通工程	500000	完成项建编制	完成项目立项
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	可研编制
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	项目建议书已上报省发改委，待批复
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	项目建议书受理
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	可研阶段编制方案
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成可研审查	完成项建受理
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	已完成项建批复，正在进行可研报告初稿编制
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	已完成项目赋码，项建书待批复
10	浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）	6000	项目开工建设	完成方案设计，初步设计初稿完成，正在优化中。
11	景宁县千峡湖库尾消落带生态修复及综合治理工程	250000	完成可研编制	计划开展项目建议书编制
12	庆元县杨楼溪水库	50982	争取完成优化批准	进行设计方案，争取三区三线调整


注：\*为列入省重大前期项目

### 三、中央投资计划执行情况

5月新增15个中央投资项目，新增中央资金7208万元。截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）17020万元，主要实施中小河流治理、中型灌区续建

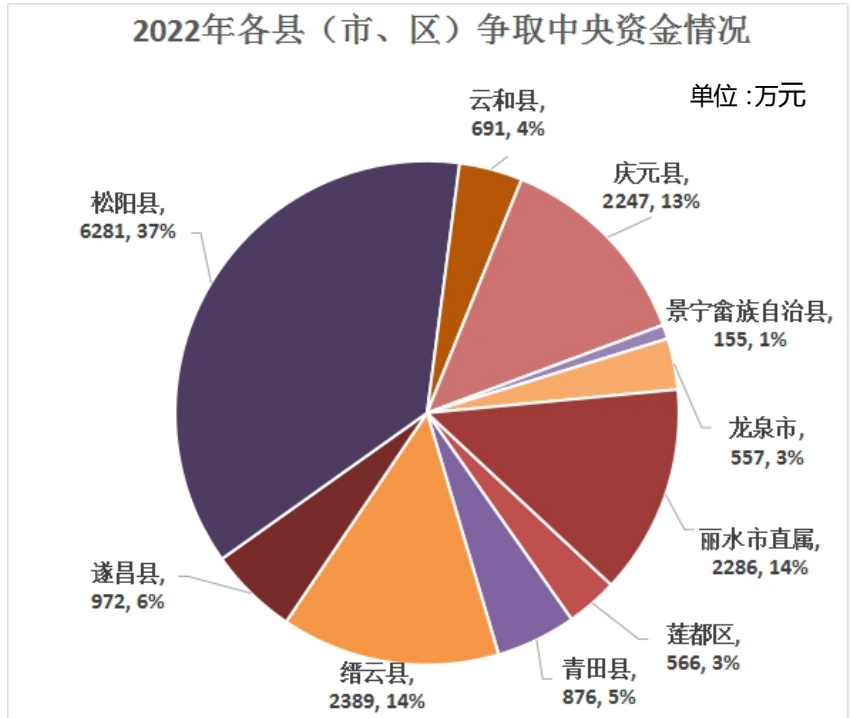

配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革等项目。截止5月底，35个项目共完成投资11330万元，其中完成中央投资6271万元，地方投资5059万元，完成率分别为36.8%和30.8%。11个项目完成率为0，均为新增项目。

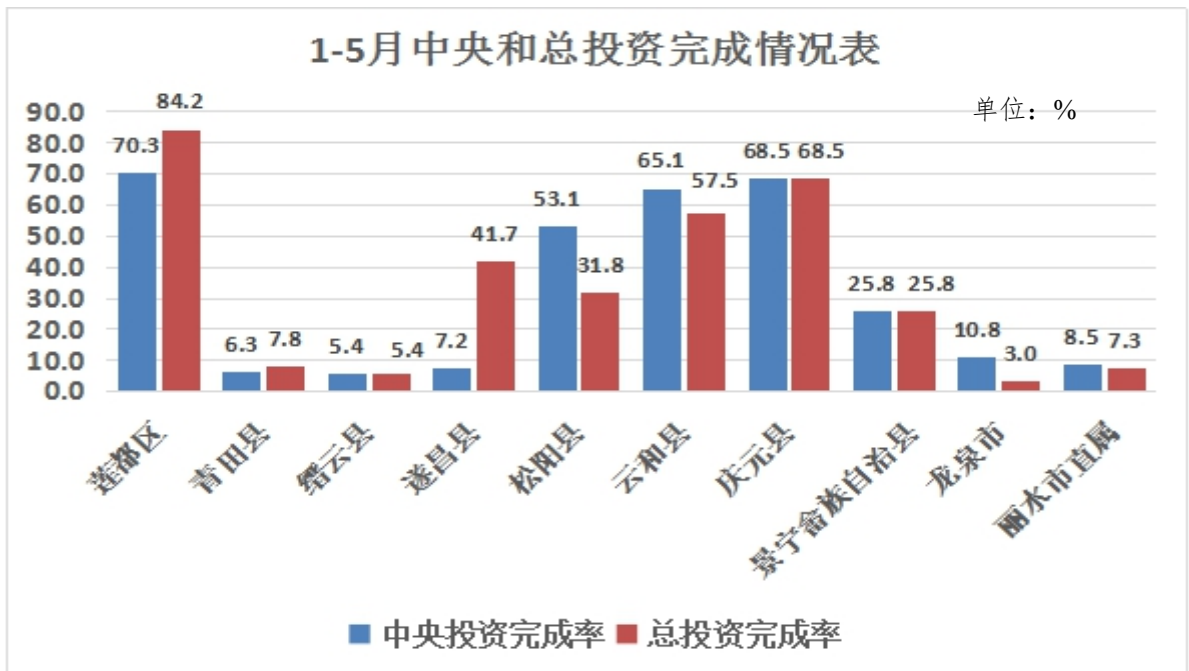

## 丽水市 2022 年 1-5 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总 计	<b>17020</b>	<b>33452</b>	<b>6271</b>	<b>11330</b>	<b>36.8%</b>	<b>33.9%</b>
莲都区		566	1063	398	895	70.3%	84.2%
	2022 年莲都区宣平流域综合治理工程	368	865	368	865	100.0%	100.0%
	莲都区 2022 年小型水库工程设施维修养护	124	124	30	30	24.2%	24.2%
	2022 年莲都区农业水价综合改革	74	74	0	0	0.0%	0.0%
青田县		876	1505	55	117	6.3%	7.8%
	青田县东坑水库水源工程	701	1128	0	0	0.0%	0.0%
	2022 年青田县小型水库工程设施维修养护	107	139	55	82	51.4%	59.0%
	青田县 2022 年农业水价综合改革	68	238	0	35	0.0%	14.7%
缙云县		2389	2389	130	130	5.4%	5.4%
	缙云县陈坑水库及配套水资源综合提升工程	2155	2155	40	40	1.9%	1.9%
	缙云县 2022 年小型水库工程设施维修养护	164	164	70	70	42.7%	42.7%
	农业水价综合改革	70	70	20	20	28.6%	28.6%
遂昌县		972	6642	70	2770	7.2%	41.7%
	遂昌县 2022 年中小流域综合治理项目	89	5500	50	2550	56.2%	46.4%
	遂昌县龙井坑水库工程	719	937	0	200	0.0%	21.3%
	遂昌县 2022 年小型水库工程设施维修养护工程	96	137	20	20	20.8%	14.6%
	遂昌县 2022 年农业水价综合改革项目	68	68	0	0	0.0%	0.0%
松阳县		6281	11435	3334	3634	53.1%	31.8%
	2022 年度松阳县松古平原水系综合治理	350	700	0	0	0.0%	0.0%
	2022 年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600	800	588	588	98.0%	73.5%
	2022 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383	4583	1000	1300	42.0%	28.4%
	2022 年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766	4150	1700	1700	96.3%	41.0%
	2022 年度松阳县周坑水库	994	994	0	0	0.0%	0.0%
	2022 年度松阳县小型水库维修养护工程	117	137	46	46	39.3%	33.6%
	2022 年度松阳县农业水价综合改革项目	71	71	0	0	0.0%	0.0%


分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		691	3391	450	1950	65.1%	57.5%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139	1639	100	1100	71.9%	67.1%
	2022年云和县云坛河流域综合治理工程	400	1600	300	800	75.0%	50.0%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91	91	50	50	54.9%	54.9%
	2022年农业水价改革	61	61	0	0	0.0%	0.0%
庆元县		2247	2247	1540	1540	68.5%	68.5%
	2022年庆元县松源流域综合治理工程	1887	1887	1480	1480	78.4%	78.4%
	2022年庆元县节水型社会	190	190	20	20	10.5%	10.5%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90	90	40	40	44.4%	44.4%
	2022年农业水价综合改革	80	80	0	0	0.0%	0.0%
景宁畲族自治县		155	155	40	40	25.8%	25.8%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91	91	40	40	44.0%	44.0%
	景宁县2022年农业水价改革	64	64	0	0	0.0%	0.0%
龙泉市		557	1978	60	60	10.8%	3.0%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379	1800	50	50	13.2%	2.8%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95	95	10	10	10.5%	10.5%
	2022年龙泉市农业水价综合改革项目	83	83	0	0	0.0%	0.0%
丽水市直属		2286	2647	194	194	8.5%	7.3%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286	647	194	194	67.8%	30.0%
	2022年河长制湖长制管理	2000	2000	0	0	0.0%	0.0%



#### 四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.24亿元，其中中央资金6亿元。

2022年各县（市、区）瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化项目中央资金情况

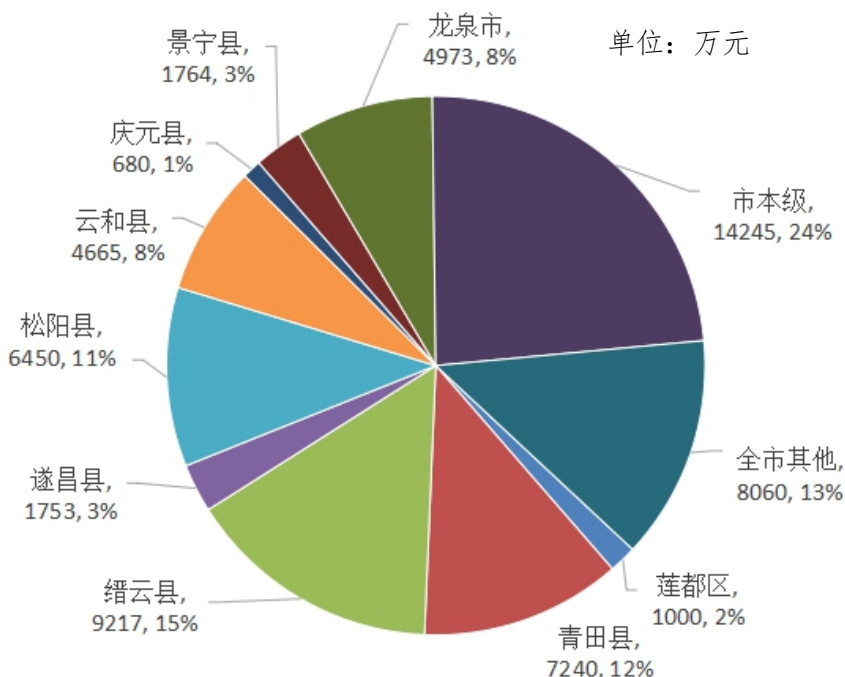

1-5月，完成投资4.02亿元，其中完成中央资金0.98亿元，完成率分别为30.3%和16.3%。龙泉市均溪流域水资源保障及水生生态修复工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、四都流域农田生态修复和提升工程、云和县浮云溪流域综合治理工程、庆元县毛垟溪流域综合治理工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造，仍处于项目前期，需加快开工，其他各个项目都有序开展。

## 瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

### 完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022年计划投资		1-5月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	<b>合 计</b>	<b>132444</b>	<b>60047</b>	<b>40178.5</b>	<b>30.3%</b>	<b>9783</b>	<b>16.3%</b>
莲都区		2000	1000	800	40.00%	100	10%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	800	40.00%	100	10%
青田县		13760	7240	3930	28.6%	1680	23.2%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	2400	26.00%	1200	24.1%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	350	20.00%	0	0.0%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	1180	39.0%	480	40.0%
缙云县		22958	9217	9036.7	38.05%	3235	35.1%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	20	12.50%	0	0.00%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	616.7	15.4%	235	10.85%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	8400	44.69%	3000	43.46%
遂昌县		3500	1753	1350	38.6%	400	22.9%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	3500	1753	1350	38.6%	400	22.9%
松阳县		13760	6450	2210	17.37%	0	0.0%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	1000	16.50%	0	0.0%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	1210	18.0%	0	0
云和县		10017	4665	2839	28.34%	1800	38.6%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	2800	46.53%	1800	41.1%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	39	0.00%	0	0.0%
庆元县		1200	680	100	8.33%	0	0.0%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	100	8.33%	0	0.0%
景宁县		4500	1764	3370	74.89%	600	34.0%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	3370	74.89%	600	34.0%

分类	工程名称	2022年计划投资		1-5月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	3368	33.26%	1968	39.6%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	2480	1435	1155	46.6%	945	65.9%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	1643	1206	773	47.05%	543	45.0%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	2535	1096	1180	46.55%	480	43.8%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	260	9.42%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	0	0.00%	0	0.0%
市本级		41623	14245	12875	30.93%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	10965	66.0%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	1910	8.00%	0	0%
其他县		9000	8060	300	3.3%	0	0
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	9000	8060	300	3.3%	0	0

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：周映辰

丽水市水利局

2022年6月7日印发
