

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2021年第16期，总第41期）

丽水市水利局办公室编

2021-9-5

1-8月全市水利计划执行情况

一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-8月完成投资23.7亿元，占年度计划的56.5%，与时序要求相差近十个百分点，完成率连续处于全省末位，全市仅青田县、景宁县、莲都区、遂昌县和云和县达到时序要求，其中龙泉市、缙云县和市本级完成率仅为47.8%、40.75%和28.33%。


本月对未纳入省月报系统统计项目进行核减。

丽水市 2021 年度水利建设投资进度表（1-8 月）

单位：亿元

| 县（市、区） | 年度目标 | 完成情况 | 完成比例（%） |
|--------|------|--------|---------|
| 市本级 | 6.9 | 1.9549 | 28.33% |
| 莲都区 | 1.0 | 0.7038 | 70.38% |
| 龙泉市 | 4.5 | 2.1515 | 47.81% |
| 青田县 | 5.0 | 3.8529 | 77.06% |
| 云和县 | 3.1 | 2.1570 | 69.58% |
| 庆元县 | 5.0 | 3.2380 | 64.76% |
| 缙云县 | 6.2 | 2.5265 | 40.75% |
| 遂昌县 | 4.0 | 2.8075 | 70.19% |
| 松阳县 | 2.1 | 1.2026 | 57.08% |

丽水市2021年水利建设投资完成率（1-8月）

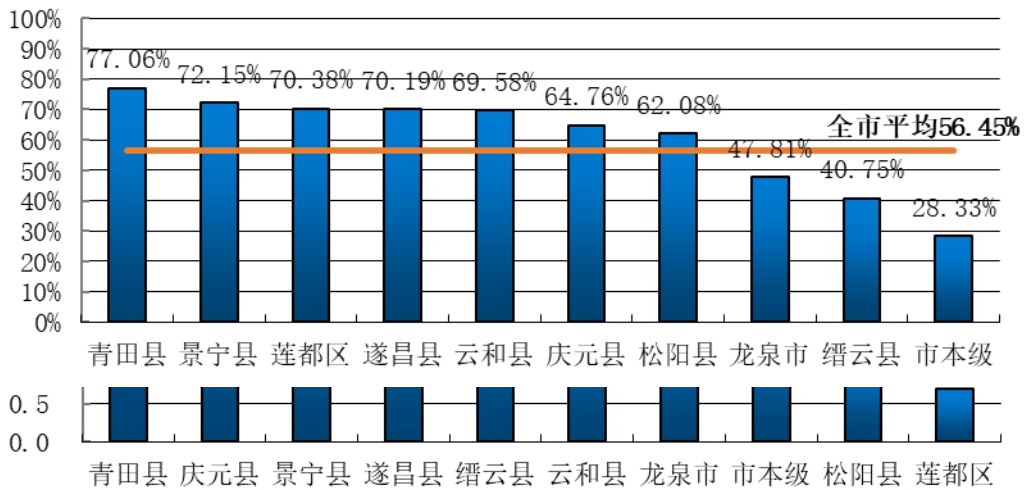

二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利16个项目列入省重大建设项目实施类，1-8月完成投资14.3亿元，占年度计划的76%，其中竹垟一级水库及供水工程和瓯江治理二期工程未达到时序要求。大溪治理提升改造工程3亿元年度投资任务调整为争先创优目标，争先创优完成率为57%。

丽水市2021年1-8月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

| 区域 | 项目名称 | 总投资 | 2021年投资计划 | 1-8月完成投资 | 完成率 |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 合计 | | 1159380 | 189400 | 143030 | 76% |
| 市本级 | 滩坑引水工程 | 70505 | 15000 | 11435 | 76% |
| 龙泉市 | 瑞垟引水工程（一期） | 21671 | 6000 | 4000 | 67% |
| | 梅溪、八都溪、岩樟流域综合治理工程 | 61672 | 10000 | 11030 | 110% |
| | 竹垟一级水库及供水工程 | 44244 | 7000 | 3940 | 56% |
| 青田县 | 瓯江治理二期工程 | 16745 | 6400 | 3835 | 60% |
| | 小溪水利枢纽工程 | 143550 | 25000 | 17602 | 70% |
| 云和县 | 龙泉溪治理二期工程 | 9333 | 5000 | 4500 | 90% |
| | 浮云溪流域综合治理工程 | 55772 | 11500 | 11900 | 103% |
| 庆元县 | 兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 40000 | 27350 | 68% |
| | 松源溪流域综合治理工程 | 60878.47 | 5000 | 3640 | 73% |
| 缙云县 | 潜明水库引水工程 | 54851 | 10000 | 8260 | 83% |
| | 好溪流域综合治理工程 | 269300 | 20000 | 13528 | 68% |
| 遂昌县 | 清水源水库工程 | 57426 | 8000 | 6945 | 87% |
| 松阳县 | 松阴溪干流综合治理工程 | 25053.75 | 4500 | 3340 | 74% |
| 景宁县 | 金村水库及供水工程 | 57629 | 10000 | 7565 | 76% |
| | 小溪流域综合治理工程（一期） | 20000 | 6000 | 4160 | 69% |

2021年，开展12个重大水利项目前期工作，其中8个省重大前期，截止8月底，市本级南明湖岸线改造工程、丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目、青田县中部、西部引水工程进展滞后，其他项目进展较为顺利。

丽水市2021年1-8月水利重大前期工作进度表

单位：万元


| 工程名称 | 总投资 | 2021年责任目标计划 | | 1-8月进度 |
|---------------------------------|--------|-------------|---------------|------------------------|
| | | 第二季度 | 第三季度 | |
| 莲湖水库* | 380000 | 开展项目建议书编制 | 开展项目建议书编制 | 完成规模论证，完成项目建议书初稿 |
| 南明湖岸线改造 | 50000 | 完成立项，开展可研编制 | 完成可研审批，开展初设编制 | 完成项目策划方案，开展招标准备 |
| 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目* | 60000 | 开展初步设计编制 | 开展初步设计编制 | 可研和初设招标阶段 |
| 莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段) | 12000 | 开展可研和初步设计编制 | 开展可研和初步设计编制 | 开展可研编制 |
| 龙泉市均溪三级水库改建工程* | 100000 | 开展规模论证报告编制 | 完成规模论证报告初稿编制 | 完成规模论证报告编制并通过专家审查 |
| 青田县中部、西部引水工程 | 50000 | 完成土地预审 | 完成可研初稿 | 选址论证审批中，可研编制中 |
| 青田县新八源水库工程* | 150000 | 完成前期专题研究 | 编制项目建议书 | 开展项目建议书编制 |
| 武义江支流—新建溪流域综合治理工程 | 30000 | 办理项目选址及用地预审 | 完成社会稳定风险评估 | 开展项目选址和用地预审(预计11月底前完成) |
| 棠溪水库项目* | 174000 | 开展可研编制 | 开展可研编制 | 完善规模论证报告，可研编制中 |
| 遂昌县成屏二级水库扩容工程* | 200000 | 拟开展项目建议书编制 | 开展项目建议书编制 | 开展项目建议书编制 |
| 遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程* | 125700 | 开展可研编制 | 开展可研编制 | 完成可研初稿 |
| 松阳县松古平原水系综合治理工程* | 135000 | 开展地勘测量工作 | 开展可行性研究报告编制 | 可行性研究报告编制中 |

注：*为列入省重大前期项目


三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取 17624 万元，主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治等项目。截止 8 月底，完成投资

2021年各县（市、区）争取中央资金情况

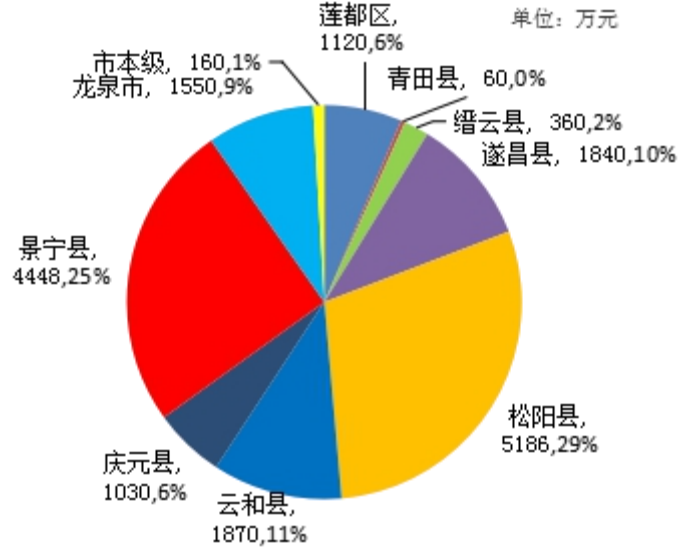

46500 万元，其中完成中央投资 15454 万元，完成率分别为 72% 和 88%，14 个项目中央资金完成率达到 100%，其中 5 个项目已完成年度投资计划。

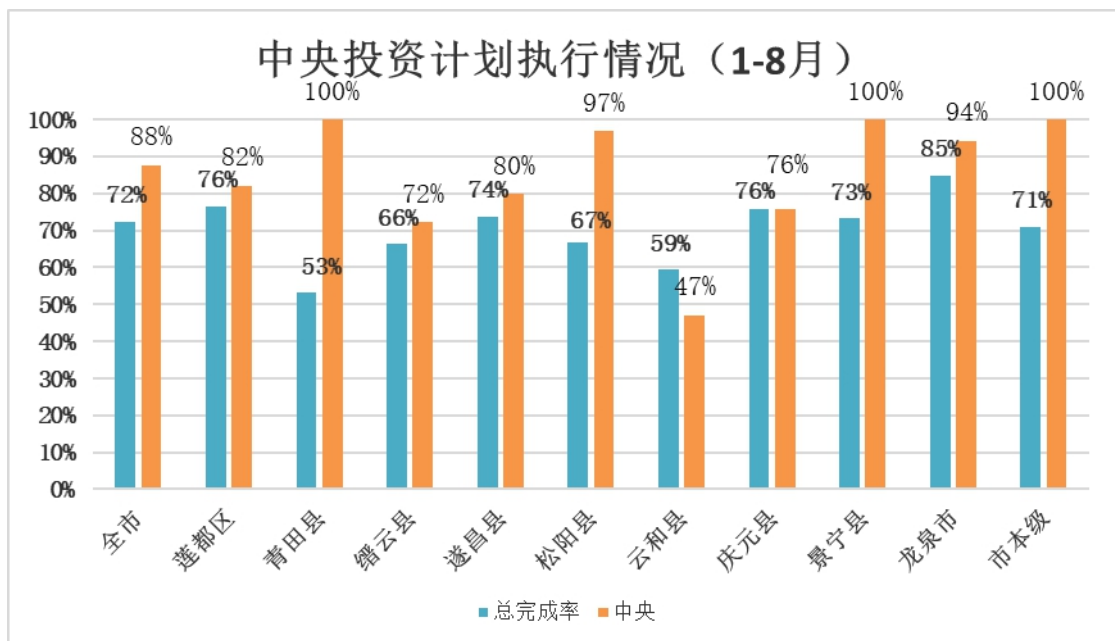

丽水市 2021 年 1-8 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

| | 项目名称 | 计划投资 | | 完成投资 | | 完成率 | |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | 总投资 | 中央投资 | 总投资 | 完成中央 | 总完成率 | 中央 |
| | 合计 | 64375 | 17624 | 46500 | 15454 | 72% | 88% |
| 莲都区 | | 2120 | 1120 | 1620 | 920 | 76% | 82% |
| | 丽水市莲都区宣平流域综合治理工程 | 2050 | 1050 | 1550 | 850 | 76% | 81% |
| | 2021 年莲都区农业水价综合改革 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% |
| 青田县 | | 196 | 60 | 104 | 60 | 53% | 100% |
| | 青田县 2021 年农业水价综合改革 | 196 | 60 | 104 | 60 | 53% | 100% |
| 缙云县 | | 513 | 360 | 340 | 260 | 66% | 72% |
| | 缙云县大力塘水库除险加固工程 | 290 | 290 | 190 | 190 | 66% | 66% |
| | 2021 年农业水价综合改革 | 223 | 70 | 150 | 70 | 67% | 100% |
| 遂昌县 | | 4070 | 1840 | 3000 | 1470 | 74% | 80% |
| | 遂昌县 2021 年中小流域综合治理项目 | 4000 | 1770 | 2930 | 1400 | 73% | 79% |
| | 遂昌县 2021 年农业水价综合改革项目 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% |
| 松阳县 | | 10106 | 5186 | 6736 | 5016 | 67% | 97% |
| | 2021 年松阳县中小流域治理 | 1200 | 730 | 900 | 730 | 75% | 100% |
| | 2021 年小港综合治理工程 | 2000 | 1000 | 1400 | 1000 | 70% | 100% |
| | 2021 年古市镇象鼻头水库除险加固工程 | 36 | 35 | 26 | 26 | 72% | 74% |
| | 2021 年古市镇谢树寮水库除险加固工程 | 213 | 205 | 84 | 84 | 39% | 41% |
| | 2021 年望松街道坑后水库除险加固工程 | 156 | 150 | 156 | 150 | 100% | 100% |
| | 2021 年度枫坪乡重点山洪沟治理工程 | 1019 | 700 | 680 | 680 | 67% | 97% |
| | 2021 年江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目 | 4500 | 2016 | 3000 | 2016 | 67% | 100% |
| | 2021 年安民溪小流域水土流失治理工程 | 912 | 280 | 610 | 280 | 67% | 100% |
| | 2021 年度农业水价综合改革项目 | 70 | 70 | 50 | 50 | 71% | 71% |
| 云和县 | | 7380 | 1870 | 4380 | 880 | 59% | 47% |
| | 2021 年安溪流域综合治理工程 | 1100 | 400 | 300 | 0 | 27% | 0% |
| | 2021 年云和县浮云溪流域综合治理工程 | 4870 | 690 | 3600 | 600 | 74% | 87% |
| | 2021 年云坛溪流域综合治理工程 | 1030 | 400 | 200 | 0 | 19% | 0% |
| | 2021 年云和县水资源节约与保护 | 320 | 320 | 220 | 220 | 69% | 69% |
| | 2021 年云和县农业水价综合改革 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% |
| 庆元县 | | 1030 | 1030 | 780 | 780 | 76% | 76% |
| | 2021 年庆元县竹口溪流域综合治理工程 | 950 | 950 | 750 | 750 | 79% | 79% |
| | 2021 庆元县农业水价综合改革 | 80 | 80 | 30 | 30 | 38% | 38% |
| 景宁县 | | 29860 | 4448 | 21860 | 4448 | 73% | 100% |
| | 景宁县 2021 年水系连通及农村水系综合整治试点县 | 29800 | 4388 | 21800 | 4388 | 73% | 100% |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 景宁县 2021 年农业水价改革 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% |
| 龙泉市 | | 8860 | 1550 | 7510 | 1460 | 85% | 94% |
| | 龙泉市 2021 年中小河流治理项目 | 8500 | 1280 | 7330 | 1280 | 86% | 100% |
| | 龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目 | 280 | 190 | 110 | 110 | 39% | 58% |
| | 龙泉市 2021 年农业水价综合改革项目 | 80 | 80 | 70 | 70 | 88% | 88% |
| 市本级 | | 240 | 160 | 170 | 160 | 71% | 100% |
| | 丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目 | 240 | 160 | 170 | 160 | 71% | 100% |

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：徐彬

丽水市水利局

2021 年 9 月 5 日印发
