

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2021年第20期，总第45期）

丽水市水利局办公室编

2021-12-13

1-11月全市水利计划执行情况

一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-11月完成投资39.27亿元，占年度计划的93.73%，达到时序进度要求，完成率连续处于全省末位。从完成率看，全市缙云县、青田县、莲都区、遂昌县、景宁县、云和县和松阳县达到时序要求，其中缙云县、青田县、莲都区和遂昌县均提前完成年度投资目标；全市龙泉市、庆元县和市本级未达到时序要求，完成率仅为89.70%，83.92%，55.91%；从投资量看，缙云县和青田县投资完成大于5亿元，松阳县和莲都区低于2亿元。


丽水市 2021 年度水利建设投资进度表（1-11 月）

单位：亿元


县（市、区）	年度目标	完成情况	完成比例（%）
市本级	6.9	3.8580	55.91%
莲都区	1.0	1.0051	100.51%
龙泉市	4.5	4.0366	89.70%
青田县	5.0	5.7735	115.47%
云和县	3.1	3.0044	96.92%
庆元县	5.0	4.1958	83.92%
缙云县	6.2	7.4269	119.79%
遂昌县	4.0	4.0041	100.10%
松阳县	2.1	1.9551	93.10%
景宁县	4.1	4.0136	97.89%
合计（平均）	41.90	39.2731	93.73%

丽水市2021年水利建设投资完成额（1-11月）

单位：亿元

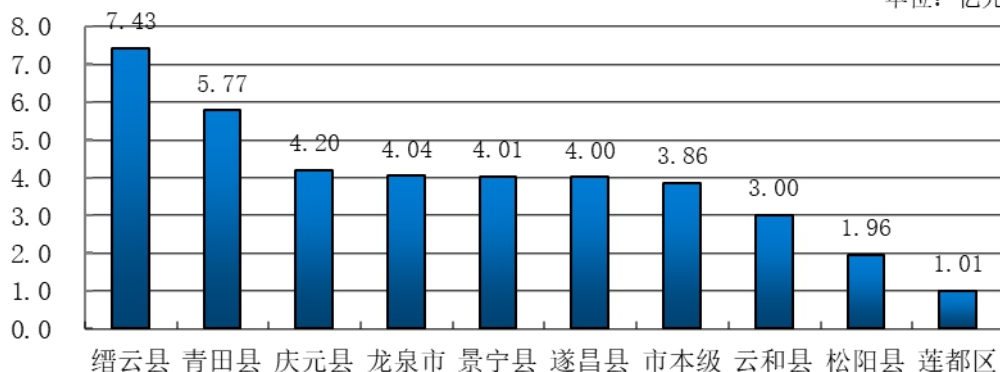

丽水市2021年水利建设投资完成率（1-11月）

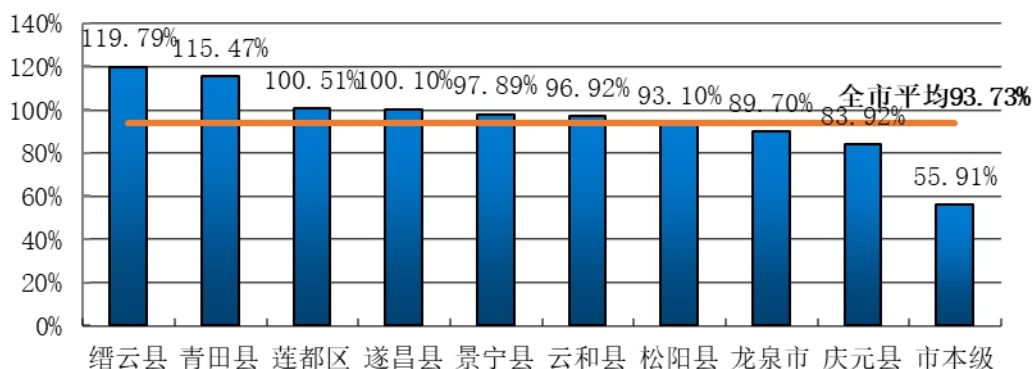

二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利16个项目列入省重大建设项目实施类，1-11月完成投资19.97亿元，占年度计划的105.43%，提前完成年度投资计划。其中兰溪桥水库扩建工程未达到时序要求。

丽水市2021年1-11月水利重大建设项目实施进度表

区域	项目名称	总投资(万元)	2021年投资计划(万元)	1-11月完成投资(万元)	完成率
合计		1159380	189400	199693	105.43%
市本级		70505	15000	17915	119.43%
	丽水市滩坑引水工程	70505	15000	17915	119.43%
龙泉市		127587	23000	27360	118.96%
	龙泉市瑞垟引水工程(一期)	21671	6000	6150	102.50%
	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟流域综合治理工程	61672	10000	14380	143.80%
	龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44244	7000	6830	97.57%
青田县		160295	31400	33945	108.11%
	瓯江治理二期工程	16745	6400	6378	99.66%
	小溪水利枢纽工程	143550	25000	27567	110.27%
云和县		65105	16500	19250	116.67%
	龙泉溪治理二期工程	9333	5000	5000	100.00%
	浮云流域综合治理工程	55772	11500	14250	123.91%
庆元县		251628.47	45000	33750	75.00%
	兰溪桥水库扩建工程	190750	40000	28750	71.88%
	松源流域综合治理工程	60878.47	5000	5000	100.00%
缙云县		324151	30000	39363.8	131.21%
	缙云县潜明水库引水工程	54851	10000	10314	103.14%
	缙云县好溪流域综合治理工程	269300	20000	29050	145.25%
遂昌县		57426	8000	8000	100.00%
	清水源水库工程	57426	8000	8000	100.00%
松阳县		25053.75	4500	4394	97.64%
	松阴溪干流综合治理工程	25053.75	4500	4394	97.64%
景宁县		77629	16000	15715	98.22%
	景宁县金村水库及供水工程	57629	10000	9875	98.75%
	景宁县小溪流域综合治理工程(一期)	20000	6000	5840	97.33%

2021年，开展12个重大水利项目前期工作，其中8个省重大前期，截止11月底，南明湖岸线改造工程、棠溪水库项目进展滞后，其他项目进展较为顺利。

丽水市2021年1-11月水利重大前期工作进度表


单位：万元

工程名称	总投资	年度目标	1-11月进度	进展情况
莲湖水库*	380000	完成规模论证	已完成项建评审，开展可研编制招标	正常
南明湖岸线改造工程	50000	完成初设审批，力争开工建设	完成可研审查	滞后
丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目*	60000	完成项建受理、可研审查	一期工程开展初设编制，二期开展可研编制	正常
莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段)	12000	完成可研编制	开展可研编制	正常
龙泉市均溪三级水库改建工程*	100000	完成规模论证	完成规模论证	正常
青田县中部、西部引水工程	50000	完成可研批复	中部引水工程完成可研审查会(开展初设编制)，西部引水工程可研编制完成(开展初设编制)	正常
青田县新八源水库工程*	150000	完成项建编制	完成项目建议书初稿	正常
武义江支流—新建溪流域综合治理工程	30000	完成可研批复	已完成用地预审和项目选址意见书，开展可研报批工作	正常
棠溪水库项目*	174000	完成可研审查	完成规模论证，可研编制	正常
遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成项建编制	项建编制中	正常
遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程*	125700	完成项建受理、可研审查	已完成省发改委赋码，省水利厅可研审查中	正常
松阳县松古平原水系综合治理工程*	135000	完成可研审批	项目可研报批稿已经完成，送审待批中	正常


注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金 17801 万元（水利专项和中央预算内，不含山水林田湖草沙一体化项目），主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治、水电扩容增效资金等项目。

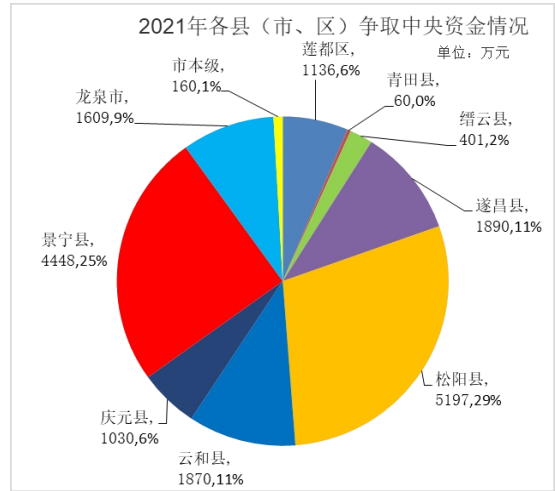

截止 11 月底，完成投资 63091 万元，其中完成中央投资 17731 万元，完成率分别为 97.4% 和 99.6%。32 个项目中央资金完成率达到 100%，其中 27 个项目已完成年度投资计划；2 个水电扩容增效项目未完成中央资金，7 个项目未完成年度投资目标，预计 12 月底均可完成。

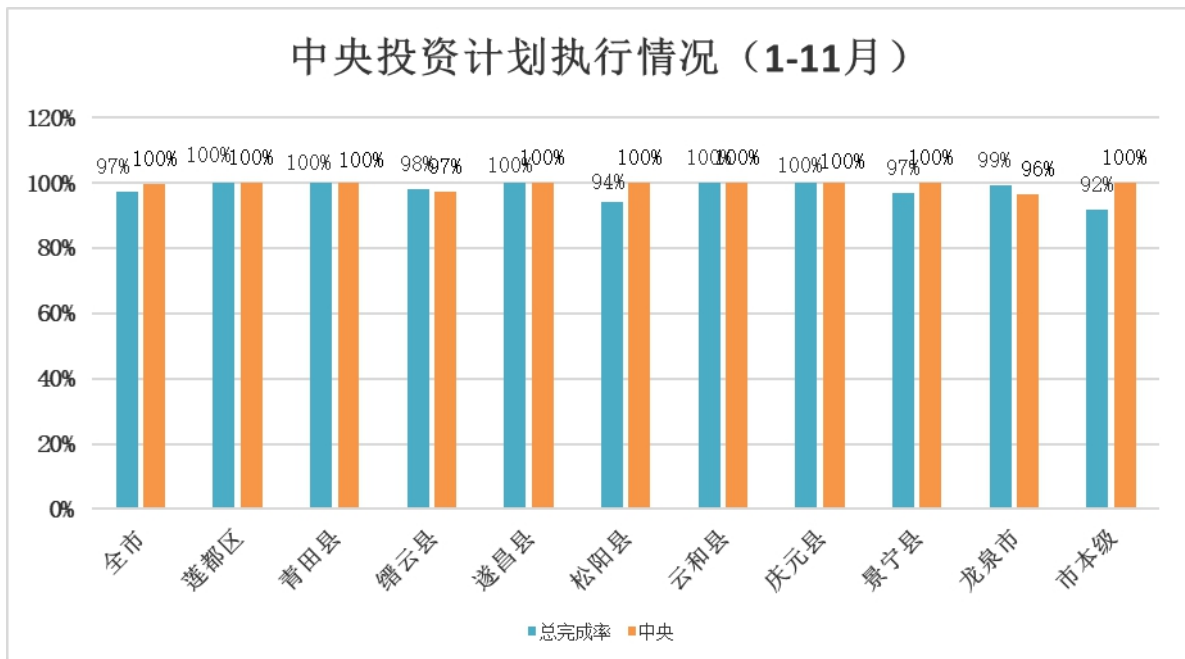

丽水市 2021 年 1-11 月中央投资项目计划完成情况表


单位：万元

	项目名称	计划投资		完成投资		完成率		备注
		总投资	中央投资	总投资	完成中央	总完成率	中央	
	合计	64798	17801	63091	17731	97.4%	99.6%	
莲都区		2136	1136	2136	1136	100%	100%	
	丽水市莲都区宣平流域综合治理工程	2050	1050	2050	1050	100%	100%	
	2021 年莲都区农业水价综合改革	70	70	70	70	100%	100%	
	2021 年水电增效扩容项目	16	16	16	16	100%	100%	9 月新增
青田县		196	60	196	60	100%	100%	
	青田县 2021 年农业水价综合改革	196	60	196	60	100%	100%	
缙云县		554	401	543	390	98%	97%	
	缙云县大力塘水库除险加固工程	290	290	290	290	100%	100%	
	2021 年缙云县农业水价综合改革	223	70	223	70	100%	100%	
	2021 年农村水电站“十三五”增效扩容改造项目奖补资金	41	41	30	30	73%	73%	9 月新增
遂昌县		4120	1890	4120	1890	100%	100%	
	遂昌县中小流域综合治理项目	4000	1770	4000	1770	100%	100%	
	遂昌县 2021 年农业水价综合改革项目	70	70	70	70	100%	100%	
	2021 年遂昌县农村水电增效扩容改造	50	50	50	50	100%	100%	9 月新增
松阳县		10117	5197	9500	5197	94%	100%	
	2021 年松阳县小港综合治理工程	2000	1000	1800	1000	90%	100%	
	2021 年松阳县中小流域治理	1200	730	1200	730	100%	100%	
	2021 年松阳县古市镇象鼻头水库除险加固工程	36	35	36	35	100%	100%	
	2021 年松阳县古市镇谢树寮水库除险加固工程	213	205	213	205	100%	100%	
	2021 年松阳县望松街道坑后水库除险加固工程	156	150	156	150	100%	100%	
	2021 年松阳县度枫坪乡重点山洪沟治理工程	1019	700	976	700	96%	100%	
	2021 年松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	4500	2016	4126	2016	92%	100%	
	2021 年松阳县农村水电增效扩容改造项目	11	11	11	11	100%	100%	9 月新增
	2021 年松阳县安民溪小流域水土流失治理工程	912	280	912	280	100%	100%	
	2021 年松阳县农业水价综合改革项目	70	70	70	70	100%	100%	
云和县		7380	1870	7380	1870	100%	100%	
	2021 年安溪流域综合治理工程	1100	400	1100	400	100%	100%	
	2021 年云和县浮云溪流域综合治理工程(将军桥至三望栏、云章、云章下游段)	4870	690	4870	690	100%	100%	

	2021年云坛流域综合治理工程	1030	400	1030	400	100%	100%	
	2021年云和县水资源节约与保护	320	320	320	320	100%	100%	
	2021年云和县农业水价综合改革	60	60	60	60	100%	100%	
庆元县		1030	1030	1030	1030	100%	100%	
	2021年庆元县竹口流域综合治理工程	950	950	950	950	100%	100%	
	2021年庆元县农业水价综合改革	80	80	80	80	100%	100%	
景宁县		29860	4448	28860	4448	97%	100%	
	景宁县2021年水系连通及农村水系综合整治试点县	29800	4388	28800	4388	97%	100%	
	景宁县2021年农业水价改革	60	60	60	60	100%	100%	
龙泉市		9165	1609	9106	1550	99%	96%	
	龙泉市梅溪、八都流域综合治理工程	8500	1280	8500	1280	100%	100%	
	龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目	280	190	280	190	100%	100%	
	龙泉市2021年农业水价综合改革项目	326	80	326	80	100%	100%	
	龙泉市2021年水电增效扩容项目	59	59	0	0	0%	0%	9月新增
市本级		240	160	220	160	92%	100%	
	丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目	240	160	220	160	92%	100%	

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2021年瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）共有22个项目。2021年计划总投资6.80亿元，其中中央资金2.09亿元。其中莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一

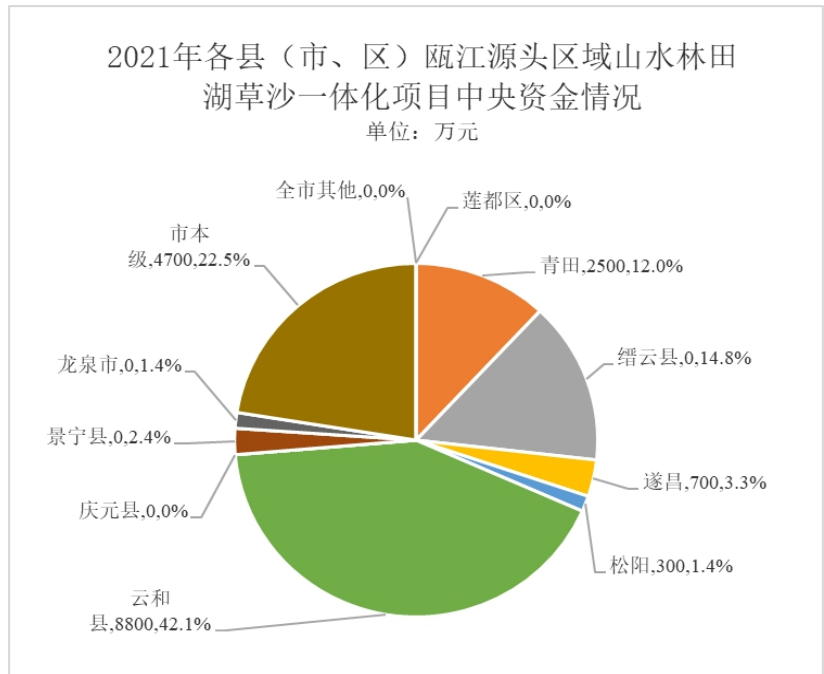

期）、缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、四都流域农田生态修复和提升工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程、丽水市大溪治理提升改造工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造2021年度投资计划为0，主要开展项目前期工作。

截止11月底，完成投资5.88亿元，完成率86.5%；其中完成中央资金1.87亿元，完成率89.5%。

丽水市 2021 年 1-11 月山水林田湖草沙一体化项目（水利）计划完成情况

单位：万元

	工程名称	2021 年度计划投资		1-11 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	67967	20900	58815	86.5%	18720	89.5%
莲都区		/	/	/	/	/	/
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	/	/	/	/	/	/
青田县		9340	2500	8660	92.7%	2150	86%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	7000	2500	6620	94.60%	2150	86%
	青田县水电生态化改造	340	/	240	70.0%	/	/
	云顶生物乐土-青田县四都港口段综合治理工程（二期）	2000	/	1800	90.0%	/	/
缙云县		10600	3100	6380	60.1%	2920	93.9%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	/	/	/	/	/	/
	潜明水库水源保护及生态修复工程	1000	500	320	32.0%	320	64.0%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好流域综合治理工程	9600	2600	6060	63.1%	2600	100.0%
遂昌县		1800	700	1400	77.8%	700	100.0%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	1800	700	1400	77.8%	700	100.0%
松阳县		797	300	717.3	90.0%	300	100%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	797	300	717.3	90.0%	300	100.0%
	四都流域农田生态修复和提升工程	/	/	/	/	/	/
云和县		21500	8800	19250	89.5%	7550	85.7%
	云和县龙泉溪治理二期工程	5000	2000	5000	100.0%	2000	100.0%
	云和县浮云流域综合治理工程	16500	6800	14250	86.4%	5550	81.6%
庆元县		200	/	15	7.5%	/	/
	庆元县毛垟流域综合治理工程	200	/	15	7.5%	/	/
景宁县		2000	500	1900	95.0%	500	100.0%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	2000	500	1900	95.0%	500	100.0%
龙泉市		1730	300	1000	57.8	100	33.3%
	龙泉市大贵流域综合治理工程	550	/	400	72.7%	/	/
	龙泉市道太流域综合治理工程	400	/	250	62.5%	/	/
	龙泉市安仁流域综合治理工程	780	300	350	44.9%	100	33.3%
	龙泉市八都流域八都镇下游段综合治理工程	/	/	/	/	/	/
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	/	/	/	/	/	/
市本级		20000	4700	19493	97.4%	4500	95.7%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	20000	4700	19493	97.4%	4500	95.7%
	丽水市大溪治理提升改造工程	/	/	/	/	/	/
全市其他		/	/	/	/	/	/
	丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造	/	/	/	/	/	/

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：徐彬

丽水市水利局

2021年12月13日印发
