

丽水市水利局简报

(水利建设投资)

(2023年第6期, 总第63期)


丽水市水利局办公室编

2023-8-11

2023年1-7月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况

2023年,全市计划完成水利建设投资60亿元,1-7月完成投资33.65亿元,全省排名第五,占年度计划的56.1%,与时序进度相差2.2个百分点,完成省厅任务52.5亿元的64.1%,全省排名第四。

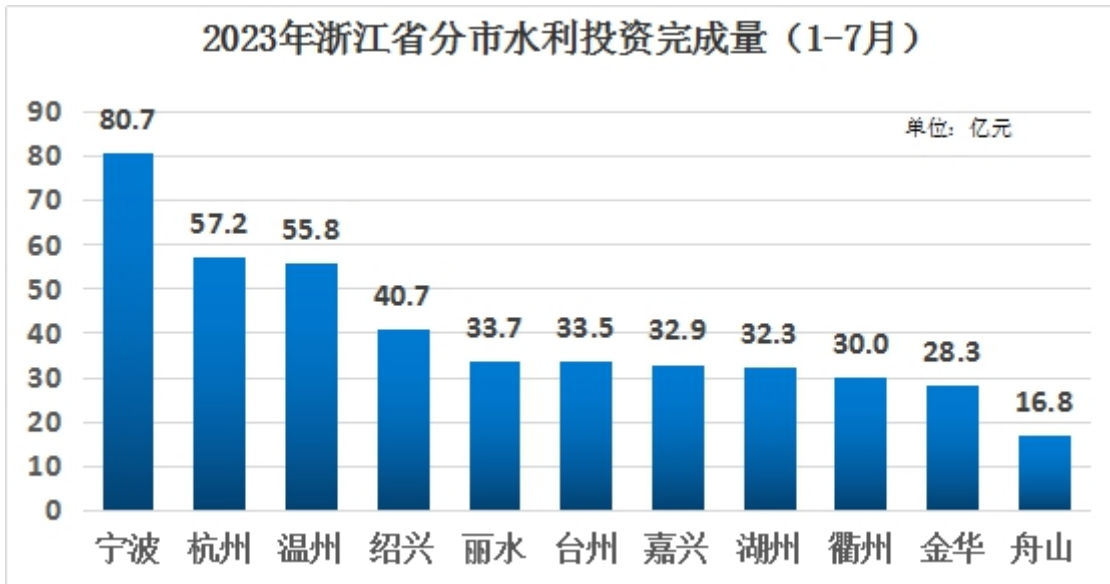


从完成率看，青田县、缙云县、遂昌县、松阳县达到时序进度，龙泉市、市本级完成率较低，均低于40%。从投资量看，缙云县、青田县、松阳县完成投资量较大，分别为6.53亿元、5.79亿元、5.16亿元，占全市总投资量的19.4%、17.2%、15.3%；莲都区和龙泉市投资量最低，均在1亿元左右。


丽水市2023年度水利建设投资进度表

单位：亿元

县(市、区)	全年目标		1-7月完成情况		
	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	完成率(60亿)
市本级	8.2	8.3	2.83	34.5%	34.1%
莲都区	2.1	2.3	1.11	52.6%	48.1%
龙泉市	2.5	3.2	0.99	39.7%	31.0%
青田县	7.0	8.2	5.79	82.7%	70.6%
云和县	2.7	3.9	2.14	79.1%	54.8%
庆元县	6.0	7.0	4.04	67.4%	57.7%
缙云县	8.0	9.4	6.53	81.7%	69.5%
遂昌县	4.8	5.6	3.40	70.8%	60.7%
松阳县	8.2	8.5	5.16	62.9%	60.7%
景宁县	3.0	3.6	1.67	55.7%	46.4%
合计	52.5	60	33.65	64.1%	56.1%

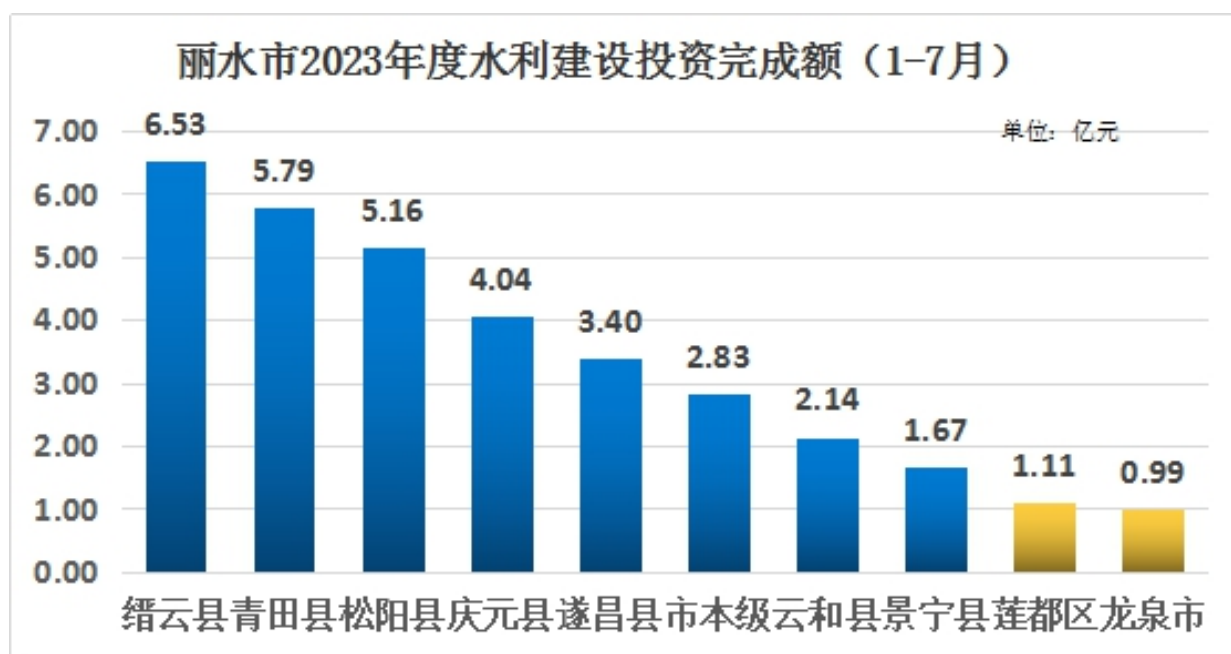

丽水市2023年度水利建设投资完成率（1-7月）

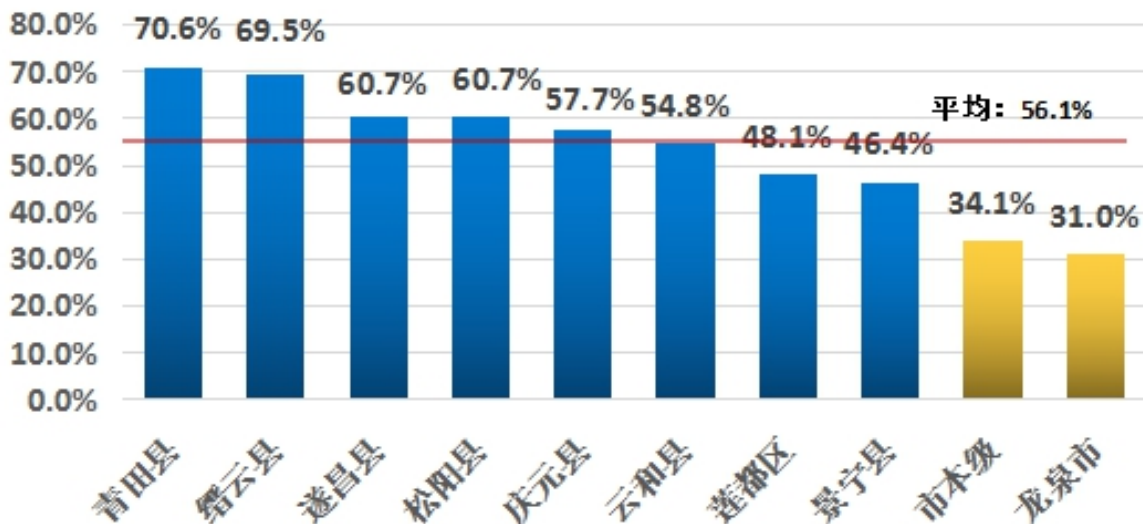

二、水利重大项目计划执行情况

2023年，全市计划投资35.4亿元，共开展32个重大水利建设项目，其中续建项目22个，新开工10个。

续建项目1-7月完成投资17.7亿元，占年度计划的49.9%，时序进度相差8.4个百分点。龙泉溪云和段综合治理工程、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程、小溪流域综合治理工程（一期）等16个项目进度符合预期；6个项目进度低于时序要求，其中，3个项目进度低于3%，分别是大溪治理提升改造工程（28.9%）、竹垌一级水库及供水工程（26.0%）、清水源水库引水工程（11.0%）。

新开工项目原计划均于下半年开工，其中列入省级新开工的2项，莲湖水库工程计划今年年底前开工建设，其年度完成5亿元难度大；双港水库及供水工程已于6月25日开工建设，并完成2000万元投资。碧湖平原水系综合治理工程（二期、三期）、龙泉市均溪三级水库改建工程和遂昌县成屏二级水库扩建工程前期工作相对滞后，今年开工难度大。

2023年，共8个项目纳入“千项万亿”，计划投资20.2亿元，1-7月完成12.5亿元，完成率61.9%，达到时序要求。

丽水市 2023 年 1-7 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资 (亿元)	2023 年投资计划			1-7 月完成情况		
				进展要求	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	计划完成率
合计			359	/	248824	353624	176507	60.7%	49.9%
续建			182	/	196824	281624	174507	73.1%	62.0%
1	市本级	滩坑引水工程*	7.1	完工见效	5000	7000	5031	100.6%	71.9%
2		城区排水防涝工程*	3.7	完工见效	500	500	500	100.0%	100.0%
3		大溪治理提升改造工程*◇	7.8	主体工程建设	15000	28000	8100	54.0%	28.9%
4		丽水市南明湖岸线改造工程	4.56	主体工程建设	/	4500	3710	/	82.4%
5		丽水南城防山洪排涝项目(桐岭溪段)◇	8.38	主体工程建设	30000	15000	9000	30.0%	60.0%
6	莲都区	碧湖平原水系综合治理工程(一期)*	1.5	完工见效	5000	5000	3530	70.6%	70.6%
7	龙泉市	梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程*	7.7	完工见效	1200	1200	1221	101.8%	101.8%
8		竹垟一级水库及供水工程*	4.4	主体工程建设	5000	10000	2600	52.0%	26.0%
9	青田县	小溪水利枢纽工程*◇	14.6	主体工程建设	20000	20000	15851	79.3%	79.3%
10		中部、西部引水工程*	4.5	主体工程建设	10000	10000	8311	83.1%	83.1%
11	云和县	浮云流域综合治理工程*	7.5	主体工程建设	5000	5000	2600	52.0%	52.0%
12		云和县龙泉溪治理二期工程*	0.9	完工见效	324	324	100	30.9%	30.9%
13		龙泉溪云和段综合治理工程◇	7	开工建设	12000	1700	7000	58.3%	411.8%
14	庆元县	兰溪桥水库扩建工程*◇	19.1	主体工程建设	20000	25000	18729	93.6%	74.9%
15		松源流域综合治理工程*	6.1	主体工程建设	8000	8000	4800	60.0%	60.0%
16	缙云县	潜明水库引水工程*	5.5	主体工程建设	5000	5000	3556	71.1%	71.1%
17		好流域综合治理工程*◇	26.9	主体工程建设	40000	50000	30340	75.9%	60.7%
18	遂昌县	清水源水库引水工程	2.65	主体工程建设	0	10000	1100	/	11.0%
19		松阴流域综合治理工程(一期、二期)	3.83	主体工程建设	0	8600	7750	/	90.1%
20	松阳县	松古平原水系综合治理工程*◇	28.7	主体工程建设	50000	60000	34008	68.0%	56.7%
21	景宁县	金村水库及供水工程*	5.8	完工见效	800	800	650	81.3%	81.3%
22		小溪流域综合治理工程(一期)*	4.2	主体工程建设	6000	6000	6020	100.3%	100.3%

序号	区域	项目名称	总投资 (亿元)	2023年投资计划			1-7月完成情况		
				进展要求	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	计划完成率
新建			176.31	/	52000	72000	2000	3.8%	2.8%
1	市本级	莲湖水库工程*	72	完成可研审批,开工建设	50000	50000	0	0.0%	0.0%
2		城市内河整治提升工程(一期)	1.8	完成初设审批, I标开工建设	/	4000	0	/	0.0%
3		丽水南城防山洪排涝项目(丽景园段)	5.27	完成初设审批,开工建设	/	5000	0	/	0.0%
4	莲都区	碧湖平原水系综合治理工程(二期、三期)*	11.3	完成可研审批,开工建设	1000	2000	0	0.0%	0.0%
5	龙泉市	龙泉市均溪三级水库改建工程*	9	完成可研批复,开工建设	完成初设批复	/	0	/	/
6	青田县	新八源水库工程*	15	完成可研批复,开工建设	完成可研审批	/	0	/	/
7	缙云县	棠溪水库工程*	24.4	完成初设批复,开工建设	完成可研审批	5000	0	/	0.0%
8	遂昌县	遂昌县成屏二级水库扩建工程*	25.7	完成可研批复,开工建设	完成初设批复	/	0	/	/
9	松阳县	团结水库	2.1	完成初设批复,开工建设	/	1000	0	/	0.0%
10	景宁县	双港水库及供水工程*◇	10	完成可研审批,一期工程开工建设	1000	5000	2000	200.0%	40.0%

注：*为列入省重大项目

◇为“千项万亿”项目

2023年，全市开展8个重大水利项目前期工作，各项目进度基本符合计划要求。浙西南两库连通开展项建书在编；联城水系综合治理项目完成立项；城市内河整治提升工程（二期）可研调整，开展初设编制；丽水南城防山洪排涝项目（核心区块）开展前期研究；雅溪水库综合利用提升工程开展可研编制；湖南镇水库综合保护与水生态修复工程（遂昌段）主报告编制中；新处水库项建阶段地质勘察中，项建同步编制中；滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程已完成项目赋码，项目建议书已受理，前期设计已招标合同已签订，可研报告初稿已完成。


丽水市 2023 年水利重大前期工作进度表

序号	县(市、区)	工程名称	总投资(亿元)	2023 年计划		1-7 月完成情况
				省级任务	总体要求	项目进展
1	市本级	浙东引水-浙西南两库连通工程*	50.0	委托开展前期工作	完成项目立项	项建书在编
2	市本级	联城水系综合治理工程	10.0	/	完成初设批复 力争开工	完成立项，开展节地评价、项目选址、可研编制
3	市本级	城市内河整治提升工程（二期）	1.8	/	完成初设批复	可研调整，同步开展初设编制
4	市本级	丽水南城防山洪排涝项目（核心区块）	4.0	/	完成初设批复	前期研究
5	莲都区	雅溪水库综合利用提升工程*	26.5	可研编制	可研编制	可研编制
6	遂昌县	湖南镇水库综合保护与水生态修复工程（遂昌段）*	4.9	完成可研审批	完成可研审批	已完成可研专项审批，主报告编制中
7	松阳县	新处水库	10	/	完成项目立项	项建阶段地质勘察中，项建同步编制中
8	景宁县	滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程*	28.4	完成可研审查	完成可研审查	项目已赋码，项目建议书已受理，前期设计合同已签，可研报告初稿已完成。

注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）21255万元，主要实施中小河流治理、中型灌区节水改造、小型水库工程实施维修养护、高风险区山洪灾害防御能力

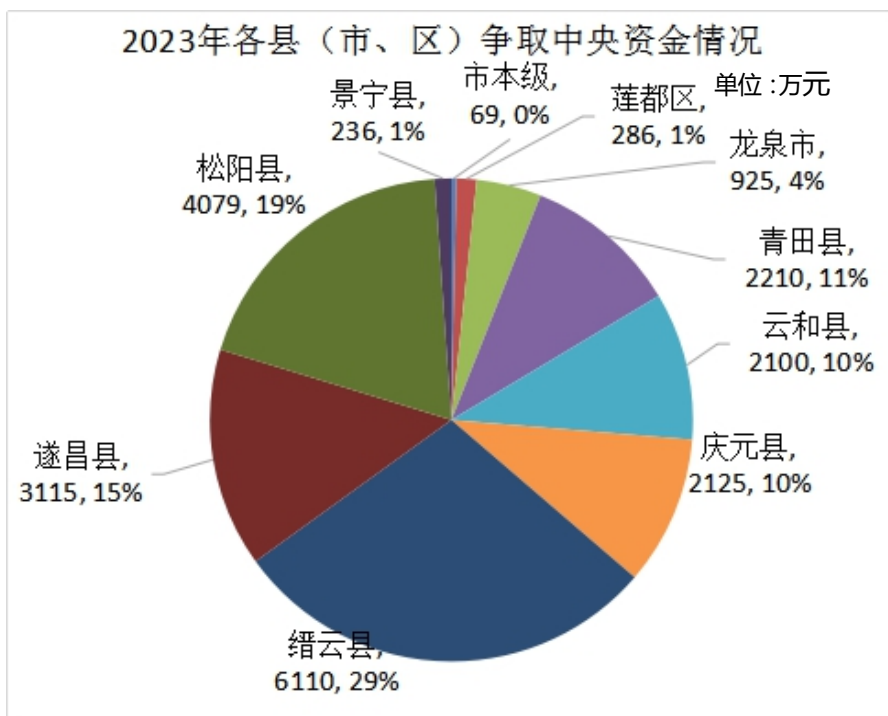

提升、小流域综合治理提质增效重点推进县建设等项目。

截止7月底，45个项目共完成投资3.10亿元，完成率为50.9%。龙泉市、景宁县、遂昌县、缙云县、莲都区的投资完成率达到时序进度，青田县官坑源小流域综合治理提质增效项目、2023年度松阳县山洪灾害防治项目、2023年丽水市本级高风险区山洪灾害防御能力提升工程等5个项目中央资金使用率为0，均为新增项目，还未开工，下一步要加快项目推进。



丽水市 2023 年 1-7 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

分类	项目名称	中央投资计划	总投资计划	已完成投资	投资计划完成率
合计		21255.0	61028.4	31034.0	50.9%
莲都区		286.0	1730.0	1014.0	58.6%
	2023 年莲都区农饮水工程维修养护	80.0	700.0	408.0	58.3%
	莲都区 2023 年小型水库工程设施维修养护	98.0	372.0	176.0	47.3%
	2023 年莲都区农业水价综合改革	108.0	658.0	430.0	65.3%
青田县		2210.0	5700.4	1629.0	28.6%
	青田县阜山乡饮用水水源(芦苇湾水库)工程	522.0	1649.0	1240.0	75.2%
	青田县 2023 年度农村供水站设施维修养护	77.0	169.5	100.0	59.0%
	青田县小型水库工程设施维修养护	81.0	112.9	89.0	78.8%
	青田县 2023 年农业水价综合改革	97.0	269.0	200.0	74.3%
	青田县官坑源小流域综合治理提质增效项目	1433.0	3500.0	0.0	0.0%
缙云县		6110.0	11989.0	7294.0	60.8%
	缙云县好溪支流方溪综合治理工程	350.0	1050.0	780.0	74.3%
	缙云县盘溪和贞溪流域综合治理工程	1651.0	2951.0	2300.0	77.9%
	缙云县好溪灌区续建配套和节水改造项目	1953.0	3544.0	1130.0	31.9%
	缙云县羊母田水库及配套水资源综合提升工程	1831.0	3990.0	2712.0	68.0%
	缙云县 2023 年农村农饮水工程维修养护	93.0	93.0	90.0	96.8%
	缙云县 2023 年小型水库工程设施维修养护	128.0	128.0	102.0	79.7%
	缙云县 2023 年农业水价综合改革	104.0	233.0	180.0	77.3%
遂昌县		3115.0	12243.0	7442.0	60.8%
	遂昌县 2023 年农村饮水工程维修养护项目	61.0	81.0	60.0	74.1%
	遂昌县 2023 年小型水库维修养护项目	74.0	105.0	70.0	66.7%
	遂昌县 2023 年农业水价改革	101.0	426.0	292.0	68.5%

分类	项目名称	中央投资计划	总投资计划	已完成投资	投资计划完成率
	遂昌县松阴河流域综合治理工程	1300.0	8000.0	5000.0	62.5%
	遂昌县乌溪江流域湖山源综合治理工程	1503.0	3418.0	2020.0	59.1%
	遂昌县新溪源数字孪生小流域山洪灾害四御能力建设国家级重点试点项目	76.0	213.0	0.0	0.0%
松阳县		4079.0	18553.0	7597.0	40.9%
	2023年度松阳县松古平原水系综合治理工程	3026.0	14200.0	5698.0	40.1%
	2023年度松阳县小港综合治理工程(二期)	700.0	4000.0	1730.0	43.3%
	2023年度松阳县农饮水维修养护工程	78.0	78.0	50.0	64.1%
	2023年度松阳县农业水价改革工程	104.0	104.0	57.0	54.8%
	2023年度松阳县山洪灾害防治项目	82.0	82.0	0.0	0.0%
	2023年度松阳县小型水库维养工程	89.0	89.0	62.0	69.7%
云和县		2100.0	5114.0	2184.0	42.7%
	2023年云和县浮云溪流域综合治理工程(崇头段、城区段)	1866.0	4866.0	2000.0	41.1%
	2023年云和县农村饮用水工程维修养护	75.0	75.0	60.0	80.0%
	2023年云和县小型水库工程设施维修养护	70.0	84.0	64.0	76.2%
	2023年云和县农业水价改革	89.0	89.0	60.0	67.4%
庆元县		2125.0	2941.0	1635.0	55.6%
	2023年庆元县竹口溪流域综合治理工程	1344.0	1394.0	850.0	61.0%
	2023年庆元县安溪溪重点山洪沟防治治理工程	430.0	1036.0	580.0	56.0%
	2023年庆元县农饮水工程维修养护	79.0	79.0	60.0	75.9%
	2023年庆元县小型水库工程设施维修养护	71.0	71.0	55.0	77.5%
	2023年庆元县农业水价综合改革	119.0	119.0	90.0	75.6%
	庆元县高风险区山洪灾害防御能力提升	82.0	242.0	0.0	0.0%
景宁畲族自治县		236.0	236.0	195.0	82.6%


分类	项目名称	中央投资计划	总投资计划	已完成投资	投资计划完成率
	景宁县 2023 年农饮水工程维修养护项目	73.0	73.0	56.0	76.7%
	景宁县 2023 年小型水库维养项目	70.0	70.0	53.0	75.7%
	景宁县 2023 年农业水价综合改革	93.0	93.0	86.0	92.5%
龙泉市		925.0	2453.0	2044.0	83.3%
	2023 年住龙镇水厂及水源建设工程（潘床水库）	647.0	1998.0	1686.0	84.4%
	2023 年龙泉市小型水库维修养护工程	75.0	75.0	58.0	77.3%
	龙泉市农饮水工程维修养护	78.0	78.0	60.0	76.9%
	2023 年龙泉市农业水价综合改革项目	125.0	302.0	240.0	79.5%
丽水市本级		69.0	69.0	0.0	0.0%
	2023 年丽水市本级高风险区山洪灾害防御能力提升工程	69.0	69.0	0.0	0.0%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2023年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.17亿元，其中中央资金7.33亿元。

1-7月，完成投资6.01亿元：其中完成中央资金2.89亿元，

完成地方资金3.11亿元，完成率分别为39.5%和53.3%，莲都区完成年度计划，完成率达100%，松阳县、龙泉市、市本级总体进展较慢。云和县浮云溪流域综合治理工程、莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）、青田县水电生态化改造等12个项目进度符合预期，4个项目进展滞后，进度低于平均完成情况，分别是松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、四都流域农田生态修复和提升工程、丽水市大溪治理提升改造工程。

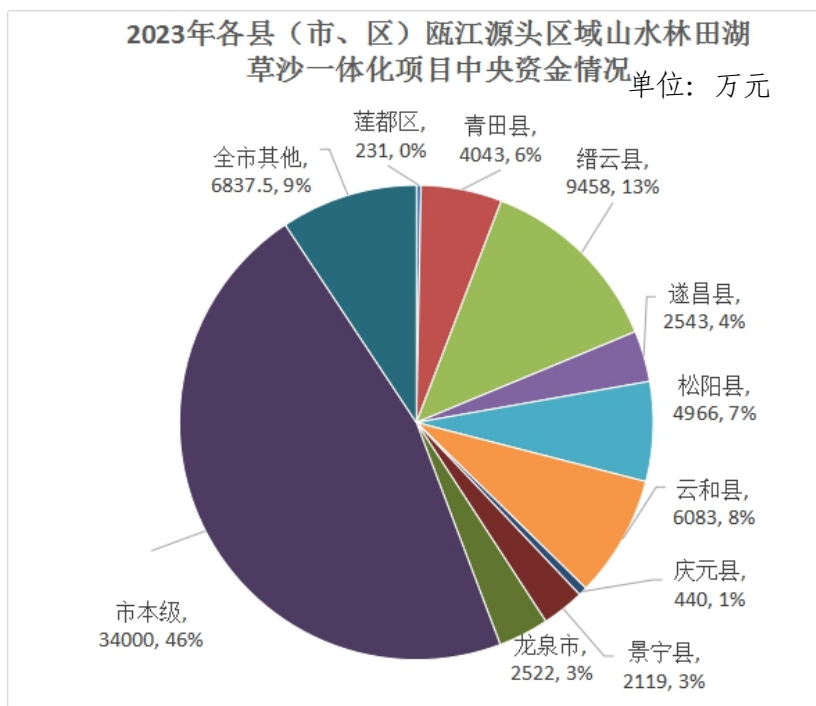

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2023年计划投资		1-7月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	131668.5	73251	60051.8	45.6%	28903	39.5%
莲都区		3000	231	3000	100.0%	231	100.0%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	3000	231	3000	100.0%	231	100.0%
青田县		10650	4043	6393	60.0%	3743	92.6%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	3471	4884	54.3%	3295	94.9%
	青田县水电生态化改造	1650	572	1509	91.5%	448	78.3%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	0	0	/	/	/	/
缙云县		23539.8	9458	12720	54.0%	5000	52.9%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	1410	1350	1320	93.6%	1300	96.3%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4231.6	1436	2700	63.8%	600	41.8%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	17898.3	6672	8700	48.6%	3100	46.5%
遂昌县		4450	2543	2700	60.7%	1390	7542.0%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	4450	1843	2700	60.7%	1390	75.4%
松阳县		16277	4966	4820	29.6%	1400	2819.0%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	4867	1506	1720	35.3%	700	46.5%
	四都流域农田生态修复和提升工程	11410	3460	3100	27.2%	700	20.2%
云和县		9183	6800	8950	97.5%	3850	63.3%
	云和县龙泉溪治理二期工程	8233	6800	7550	91.7%	3850	56.6%
	云和县浮云流域综合治理工程	950	0	1400	147.4%	0	/
庆元县		1600	440	970	60.6%	400	90.9%
	庆元县毛垟流域综合治理工程	1600	440	970	60.6%	400	90.9%

分类	工程名称	2023 年计划投资		1-7 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
景宁县		2119	2119	1500	70.8%	600	28.3%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	2119	2119	1500	70.8%	600	28.3%
龙泉市		8519	2522	3794	44.5%	2063	81.8%
	龙泉市大贵溪流域综合治理工程	1470	537	760	51.7%	500	93.1%
	龙泉市道太溪流域综合治理工程	944	109	510	54.0%	109	100.0%
	龙泉市安仁溪流域综合治理工程	1585	357	800	50.5%	300	84.0%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	4030	1240	1165	28.9%	875	70.6%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	820	279	559	68.2%	279	100.0%
市本级		42513	34000	9213	21.7%	6000	17.6%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	1113	0	1113	100.0%	0	/
	丽水市大溪治理提升改造工程	41400	34000	8100	19.6%	6000	17.6%
其他县		9652.5	6837.5	5991.9	62.1%	4225.96	61.8%
	丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造	9652.5	6837.5	5991.9	62.1%	4225.96	61.8%

送：李汉勤副市长，叶龙标副秘书长，各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：罗俊

编辑：周映辰

丽水市水利局

2023 年 8 月 11 日印发
