

丽水市水利局简报

(水利建设投资)

(2021 年第 19 期, 总第 44 期)

丽水市水利局办公室编

2021-11-05

1-10 月全市水利计划执行情况

一、水利投资完成情况

2021 年全市计划完成水利建设投资 41.9 亿元, 1-10 月完成投资 34.87 亿元, 占年度计划的 83.21%, 与时序要求相差 0.12%, 完成率连续处于全省末位。从完成率看, 全市缙云县、青田县、莲都区、景宁县、遂昌县和云和县达到时序要求, 其中缙云县、青田县均提前完成年度投资目标; 全市松阳县、庆元县、龙泉市和市本级未达到时序要求, 其中市本级完成率仅为 47.05%; 从投资量看, 缙云县和青田县投资完成大于 5 亿元, 松阳县和莲都区低于 2 亿元。


丽水市 2021 年度水利建设投资进度表（1-10 月）

单位：亿元


县（市、区）	年度目标	完成情况	完成比例（%）
市本级	6.9	3.2452	47.03%
莲都区	1.0	0.9398	93.98%
龙泉市	4.5	3.1480	69.96%
青田县	5.0	5.0409	100.82%
云和县	3.1	2.6531	85.58%
庆元县	5.0	3.6981	73.96%
缙云县	6.2	7.1432	115.21%
遂昌县	4.0	3.5717	89.29%
松阳县	2.1	1.6818	80.09%
景宁县	4.1	3.7451	91.34%
合计（平均）	41.90	34.8669	83.21%

丽水市2021年水利建设投资完成额（1-10月）

单位：亿元

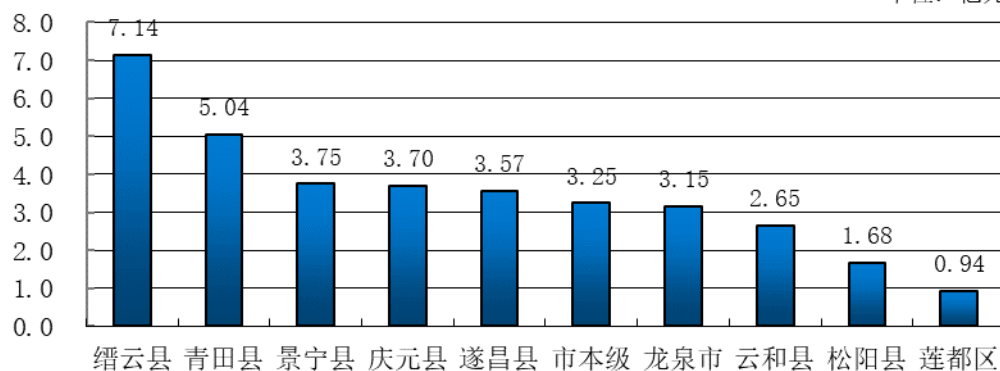

丽水市2021年水利建设投资完成率（1-10月）

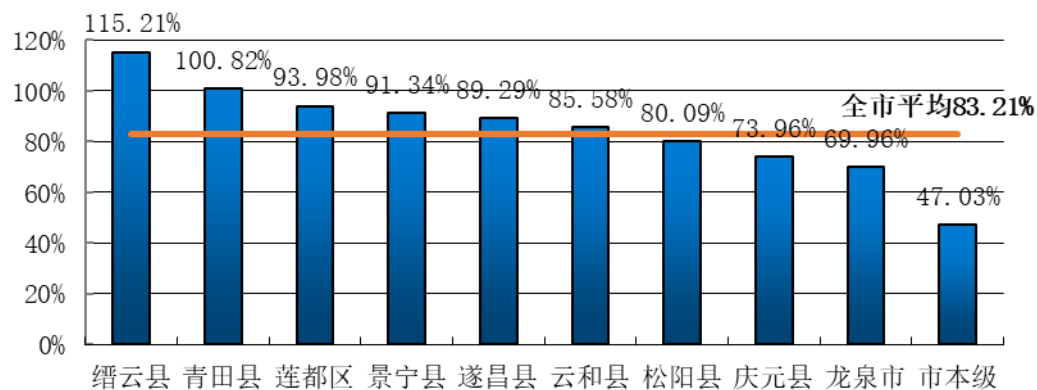

二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利16个项目列入省重大建设项目实施类，1-10月完成投资18.5亿元，占年度计划的97.84%，其中兰溪桥水库扩建工程未达到时序要求。

丽水市2021年1-10月水利重大建设项目实施进度表

区域	项目名称	总投资(万元)	2021年投资计划(万元)	1-10月完成投资(万元)	完成率
合计		1159380	189400	185312	97.84%
市本级		70505	15000	15502	103.35%
	丽水市滩坑引水工程	70505	15000	15502	103.35%
龙泉市		127587	23000	25310	110.04%
	龙泉市瑞垟引水工程(一期)	21671	6000	5600	93.33%
	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟流域综合治理工程	61672	10000	13680	136.80%
	龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44244	7000	6030	86.14%
青田县		160295	31400	29972	95.45%
	瓯江治理二期工程	16745	6400	5925	92.58%
	小溪水利枢纽工程	143550	25000	24047	96.19%
云和县		65105	16500	18300	110.91%
	龙泉溪治理二期工程	9333	5000	4500	90.00%
	浮云溪流域综合治理工程	55772	11500	13800	120.00%
庆元县		251628.47	45000	32240	71.64%
	兰溪桥水库扩建工程	190750	40000	27750	69.38%
	松源河流域综合治理工程	60878.47	5000	4490	89.80%
缙云县		324151	30000	37137.8	123.79%
	缙云县潜明水库引水工程	54851	10000	9709	97.09%
	缙云县好溪流域综合治理工程	269300	20000	27429	137.15%
遂昌县		57426	8000	8000	100.00%
	清水源水库工程	57426	8000	8000	100.00%
松阳县		25053.75	4500	4135	91.89%
	松阴溪干流综合治理工程	25053.75	4500	4135	91.89%
景宁县		77629	16000	14715	91.97%
	景宁县金村水库及供水工程	57629	10000	9425	94.25%
	景宁县小溪流域综合治理工程(一期)	20000	6000	5290	88.17%

2021年，开展12个重大水利项目前期工作，其中8个省重大前期，截止10月底，南明湖岸线改造工程、棠溪水库项目进展滞后，其他项目进展较为顺利。

丽水市2021年1-10月水利重大前期工作进度表


单位：万元

工程名称	总投资	年度目标	1-10月进度	进展情况
莲湖水库*	380000	完成规模论证	完成项目建议书送审稿	正常
南明湖岸线改造工程	50000	完成初设审批，力争开工建设	完成全过程咨询招标，开展项建编制	滞后
丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目*	60000	完成项建受理、可研审查	一期工程开展初设编制，二期开展可研编制	正常
莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段)	12000	完成可研编制	开展可研编制	正常
龙泉市均溪三级水库改建工程*	100000	完成规模论证	完成规模论证	正常
青田县中部、西部引水工程	50000	完成可研批复	中部引水工程完成选址工作，西部引水工程开展选址工作	正常
青田县新八源水库工程*	150000	完成项建编制	开展项建书编制	正常
武义江支流—新建溪流域综合治理工程	30000	完成可研批复	完成可研审查，用地预审已报批，开展项目选址意见书工作	正常
棠溪水库项目*	174000	完成可研审查	完善规模论证报告，可研编制中	滞后
遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成项建编制	开展项目建议书编制	正常
遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程*	125700	完成项建受理、可研审查	已完成省发改委赋码，省水利厅可研审查中	正常
松阳县松古平原水系综合治理工程*	135000	完成可研审批	已完成可研审查，目前可研报告按要求修改中	正常

注：*为列入省重大前期项目


三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金 17801 万元（水利专项和中央预算内，不含山水林田湖草沙一体化项目），主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治、水电扩容增效资金等项目。

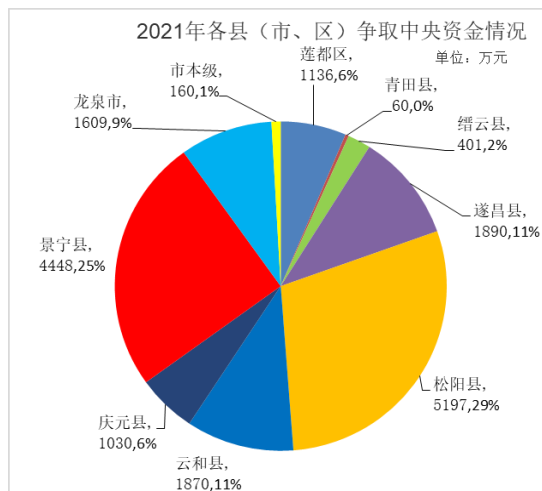

9月新增水电扩容增效资金共计 177 万元，包括莲都区 16 万元、缙云县 41 万元、遂昌县 50 万元、松阳县 11 万元、龙泉市 59 万元。

截止 10 月底，完成投资 58938 万元，其中完成中央投资 17445 万元，完成率分别为 91%和 98%。24 个项目中央资金完成率达到 100%，其中 13 个项目已完成年度投资计划。

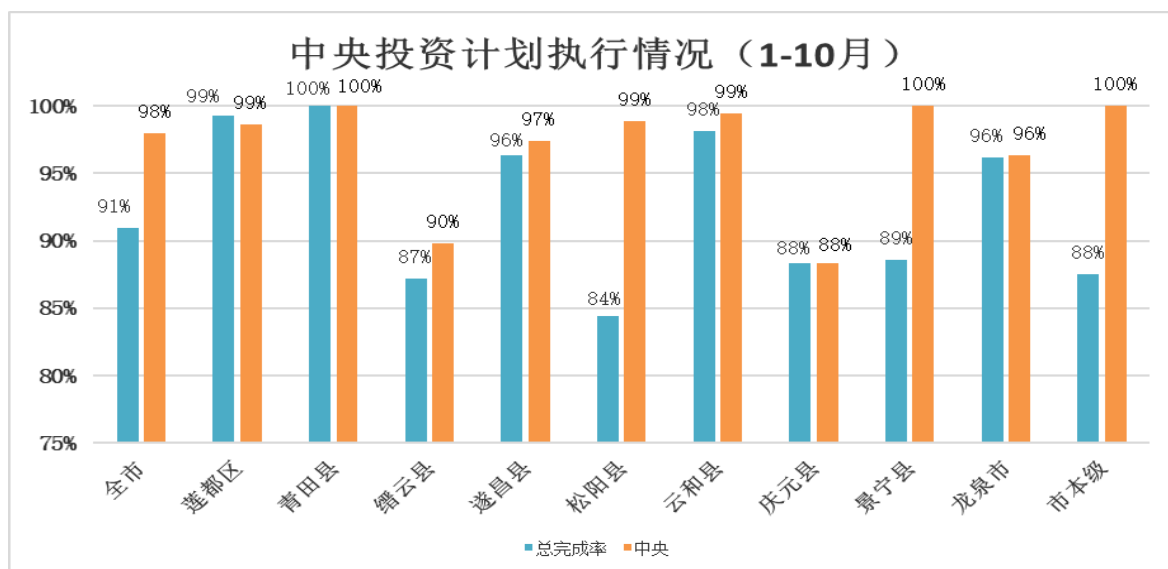

丽水市 2021 年 1-10 月中央投资项目计划完成情况表


单位：万元

	项目名称	计划投资		完成投资		完成率		备注
		总投资	中央投资	总投资	完成中央	总完成率	中央	
	合计	64798	17801	58938	17445	91%	98%	
莲都区		2136	1136	2120	1120	99%	99%	
	丽水市莲都区宣平流域综合治理工程	2050	1050	2050	1050	100%	100%	
	2021 年莲都区农业水价综合改革	70	70	70	70	100%	100%	
	2021 年水电增效扩容项目	16	16	0	0	0%	0%	9 月新增
青田县		196	60	196	60	100%	100%	
	青田县 2021 年农业水价综合改革	196	60	196	60	100%	100%	
缙云县		554	401	483	360	87%	90%	
	缙云县大力塘水库除险加固工程	290	290	290	290	100%	100%	
	2021 年缙云县农业水价综合改革	223	70	193	70	87%	100%	
	2021 年农村水电站“十三五”增效扩容改造项目奖补资金	41	41	0	0	0%	0%	9 月新增
遂昌县		4120	1890	3970	1840	96%	97%	
	遂昌县中小流域综合治理项目	4000	1770	3900	1770	98%	100%	
	遂昌县 2021 年农业水价综合改革项目	70	70	70	70	100%	100%	
	2021 年遂昌县农村水电增效扩容改造	50	50	0	0	0%	0%	9 月新增
松阳县		10117	5197	8537	5137	84%	99%	
	2021 年松阳县小港综合治理工程	2000	1000	1700	1000	85%	100%	
	2021 年松阳县中小流域治理	1200	730	1025	730	85%	100%	
	2021 年松阳县古市镇象鼻头水库除险加固工程	36	35	36	35	100%	100%	
	2021 年松阳县古市镇谢树寮水库除险加固工程	213	205	178	176	84%	86%	
	2021 年松阳县望松街道坑后水库除险加固工程	156	150	156	150	100%	100%	
	2021 年松阳县度枫坪乡重点山洪沟治理工程	1019	700	846	680	83%	97%	
	2021 年松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	4500	2016	3751	2016	83%	100%	
	2021 年松阳县农村水电增效扩容改造项目	11	11	0	0	0%	0%	9 月新增
	2021 年松阳县安民溪小流域水土流失治理工程	912	280	775	280	85%	100%	
	2021 年松阳县农业水价综合改革项目	70	70	70	70	100%	100%	
云和县		7380	1870	7240	1860	98%	99%	
	2021 年安溪流域综合治理工程	1100	400	1100	400	100%	100%	
	2021 年云和县浮云河流域综合治理工程(将军桥至三望栏、云章、云章下游段)	4870	690	4870	690	100%	100%	

	2021年云坛流域综合治理工程	1030	400	900	400	87%	100%	
	2021年云和县水资源节约与保护	320	320	310	310	97%	97%	
	2021年云和县农业水价综合改革	60	60	60	60	100%	100%	
庆元县		1030	1030	910	910	88%	88%	
	2021年庆元县竹口流域综合治理工程	950	950	850	850	89%	89%	
	2021年庆元县农业水价综合改革	80	80	60	60	75%	75%	
景宁县		29860	4448	26460	4448	89%	100%	
	景宁县2021年水系连通及农村水系综合整治试点县	29800	4388	26400	4388	89%	100%	
	景宁县2021年农业水价改革	60	60	60	60	100%	100%	
龙泉市		9165	1609	8812	1550	96%	96%	
	龙泉市梅溪、八都溪流域综合治理工程	8500	1280	8292	1280	98%	100%	
	龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目	280	190	280	190	100%	100%	
	龙泉市2021年农业水价综合改革项目	326	80	240	80	74%	100%	
	龙泉市2021年水电增效扩容项目	59	59	0	0	0%	0%	9月新增
市本级		240	160	210	160	88%	100%	
	丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目	240	160	210	160	88%	100%	

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2021 年瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）共有 19 个项目。2021 年计划总投资 6.80 亿元，其中中央资金 2.09 亿元。其中莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期、二期）、丽水市大溪治理提

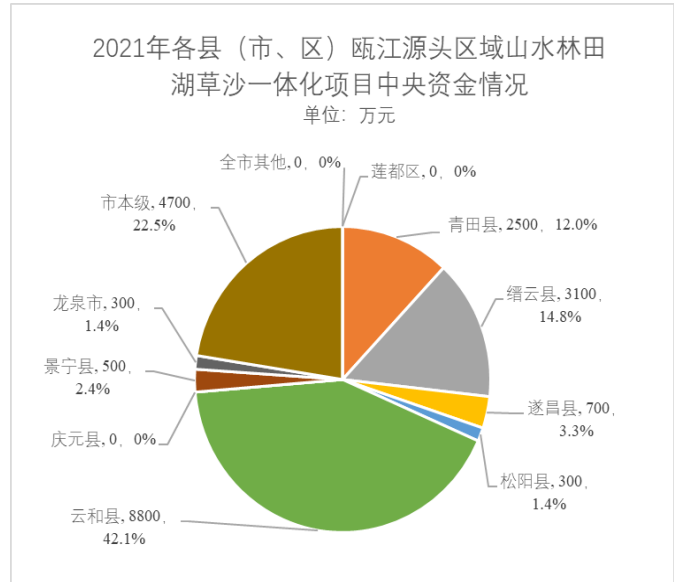

升改造工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造 2021 年度投资计划为 0，主要开展项目前期工作。

截止 10 月底，完成投资 5.29 亿元，完成率 77.8%；其中完成中央资金 1.35 亿元，完成率 64.4%。从完成率看，投资总额完成率全市景宁县、云和县、松阳县、青田县达到时序要求；由于中央资金 8 月下达，目前中央资金完成率全市市本级、松阳县、景宁县、云和县、青田县过半。

丽水市 2021 年 1-10 月山水林田湖草沙一体化项目（水利）计划完成情况

单位：万元

	工程名称	2021 年度计划投资		1-10 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	67967	20900	52858	77.8%	13457	64.4%
莲都区		/	/	/	/	/	/
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	/	/	/	/	/	/
青田县		9340	2500	7840	83.9%	1750	70.0%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	7000	2500	6170	88.1%	1750	70.0%
	青田县水电生态化改造	340	/	70	20.6%	/	/
	云顶生物乐土-青田县四都港口段综合治理工程（二期）	2000	/	1600	80.0%	/	/
缙云县		10600	3100	7117	67.1%	0	0.0%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	7600	2600	6000	78.9%	0	0.0%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	1000	500	0	0.0%	0	0.0%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好流域综合治理-壶镇至仙都段河道综合治理工程	2000	/	1117	55.9%	/	/
遂昌县		1800	700	700	38.9%	172	24.6%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	1800	700	700	38.9%	172	24.6%
松阳县		797	300	677	84.9%	255	85.0%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	797	300	677	84.9%	255	85.0%
云和县		21500	8800	18300	85.1%	6600	75.0%
	云和县龙泉溪治理二期工程	5000	2000	4500	90.0%	1500	75.0%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	16500	6800	13800	83.6%	5100	75.0%
庆元县		200	/	10	5.0%	/	/
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	200	/	10	5.0%	/	/
景宁县		2000	500	1800	90.0%	400	80.0%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	2000	500	1800	90.0%	400	80.0%
龙泉市		1730	300	530	30.6%	80	26.7%
	龙泉市大贵溪流域综合治理工程	550	/	150	27.3%	/	/
	龙泉市道太溪流域综合治理工程	400	/	100	25.0%	/	/
	龙泉市安仁溪流域综合治理工程	780	300	280	35.9%	80	26.7%
市本级		20000	4700	15884	79.4%	4200	89.4%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	20000	4700	15884	79.4%	4200	89.4%
	丽水市大溪治理提升改造工程	/	/	/	/	/	/
全市其他		/	/	/	/	/	/
	丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造	/	/	/	/	/	/

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：徐彬

丽水市水利局

2021年11月5日印发
