丽水市水利局简报

(水利建设投资)

(2021年第18期, 总第43期)

丽水市水利局办公室编

2021-10-15

1-9 月全市水利计划执行情况

一、水利投资完成情况


2021年全市计划完成水利建设投资 41.9亿元,1-9月完成投资 29.05亿元,占年度计划的 69.33%,与时序要求相差近六个百分点,完成率连续处于全省末位。从完成率看,全市仅青田县、莲都区、景宁县、遂昌县和缙云县达到时序要求,其中龙泉市和市本级完成率仅为 57.70%和 39.46%;从投资量看,松阳县和莲都区低于 2亿元。

丽水市 2021 年度水利建设投资进度表 (1-9 月)


单位: 亿元

1 12. 10/0			
县(市、区)	年度目标	完成情况	完成比例(%)
市本级	6. 9	2. 7224	39. 46%
莲都区	1.0	0. 8728	87. 28%
龙泉市	4. 5	2. 5964	57.70%
青田县	5. 0	4. 3912	87. 82%
云和县	3. 1	2. 3120	74. 58%
庆元县	5. 0	3. 4000	68.00%
缙云县	6. 2	4. 7249	76. 21%
遂昌县	4. 0	3. 2359	80.90%
松阳县	2. 1	1. 4415	68. 64%
景宁县	4. 1	3. 3531	81. 78%
合计(平均)	41. 90	29. 0502	69. 33%

丽水市2021年水利建设投资完成额(1-9月)



丽水市2021年水利建设投资完成率(1-9月)



二、水利重大项目计划执行情况

2021年,全市水利 16 个项目列入省重大建设项目实施类, 1-9 月完成投资 16.9 亿元,占年度计划的 89.36%,其中竹**垟**一级 水库及供水工程和兰溪桥水库扩建工程未达到时序要求。省级水 利重大项目争先创优完成率为 75%。

丽水市 2021 年 1-9 月水利重大建设项目实施进度表

- Ib	T 1 1 1	总投资(万	2021 年投资	1-9 月完成	0-10-	
区域	· 项目名称	元)	计划 (万元)	投资(万元)	完成率	
	合计	1159380	189400	169254	89. 36%	
市本级		70505	15000	13397	89. 31%	
	丽水市滩坑引水工程	70505	15000	13397	89. 31%	
龙泉市		127587	23000	22260	96. 78%	
	龙泉市瑞 垟 引水工程(一期)	21671	6000	4800	80.00%	
	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合 治理工程	61672	10000	12580	125. 80%	
	龙泉市竹 垟 一级水库及供水工程	44244	7000	4880	69.71%	
青田县		160295	31400	25027	79.70%	
	瓯江治理二期工程	16745	6400	5125	80.08%	
	小溪水利枢纽工程	143550	25000	19902	79.61%	
云和县		65105	16500	16600	100.61%	
	龙泉溪治理二期工程	9333	5000	4500	90.00%	
	浮云溪流域综合治理工程	55772	11500	12100	105.22%	
庆元县		251628.47	45000	32530	72. 29%	
	兰溪桥水库扩建工程	190750	40000	28550	71. 38%	
	松源溪流域综合治理工程	60878.47	5000	3980	79.60%	
缙云县		324151	30000	34624.8	115. 42%	
	缙云县潜明水库引水工程	54851	10000	9096	90.96%	
	缙云县好溪流域综合治理工程	269300	20000	25529	127.65%	
遂昌县		57426	8000	7845	98.06%	
	清水源水库工程	57426	8000	7845	98.06%	
松阳县		25053.75	4500	3715	82.56%	
	松阴溪干流综合治理工程	25053.75	4500	3715	82.56%	
景宁县		77629	16000	13255	82.84%	
	景宁县金村水库及供水工程	57629	10000	8545	85.45%	
	景宁县小溪流域综合治理工程(一期)	20000	6000	4710	78.50%	

2021年,开展12个重大水利项目前期工作,其中8个省重

大前期,截止9月底,市本级南明湖岸线改造工程、莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段)进展滞后,其他项目进展较为顺利。

丽水市 2021 年 1-9 月水利重大前期工作进度表


单位: 万元

			平似:	カル
工程名称	总投资	年度目标	1-9 月进度	进展情况
莲湖水库*	380000	完成规模论证	第三方论证结题; 完成项目 建议书送审稿	正常
南明湖岸线改造	50000	完成初设审批,力争 开工建设	完成项目策划方案,开展全 过程咨询招标	滞后
丽水市莲都区碧湖平原水系综合治 理项目*	60000	完成项建受理、可研 审查	一期工程开展初设编制,二 期开展可研编制	正常
莲都区小安溪流域治理提升工程 (小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段)	12000	完成可研和初步设计 编制	开展可研编制	滞后
龙泉市均溪三级水库改建工程*	100000	完成规模论证	完成规模论证报告编制	正常
青田县中部、西部引水工程	50000	完成可研批复	准备召开可研审查会	正常
青田县新八源水库工程*	150000	完成项建编制	开展项建书编制	正常
武义江支流—新建溪流域综合治理 工程	30000	完成可研批复	用地预审已报批	正常
棠溪水库项目*	174000	完成可研审查	完善规模论证报告,可研编 制中	正常
遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成项建编制	开展项目建议书编制	正常
遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生 态修复工程*	125700	完成项建受理、可研 审查	已完成省发改委赋码,省水 利厅可研审查中	正常
松阳县松古平原水系综合治理工程 *	135000	完成可研审批	可行性研究报告编制中,已 确定工程全过程咨询中标 单位	正常

注: *为列入省重大前期项目


三、中央投资计划执行情况

截止目前,全市共争取中央资金 17801 万元(水利专项和中央预算内,不含山水林田湖草沙一体化项目),主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合



改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治、水电扩容增效资金等项目。本月新增水电扩容增效资金 共计177万元,包括莲都区16万元、缙云县41万元、遂昌县50 万元、松阳县11万元、龙泉市59万元。

截止9月底,完成投资53286万元,其中完成中央投资16618万元,完成率分别为82%和93%。19个项目中央资金完成率达到100%,其中9个项目已完成年度投资计划。除本月新增外,4个项目中央资金未达到时序要求,其中云和县云坛溪流域综合治理工程未开工建设,中央完成率为0%。

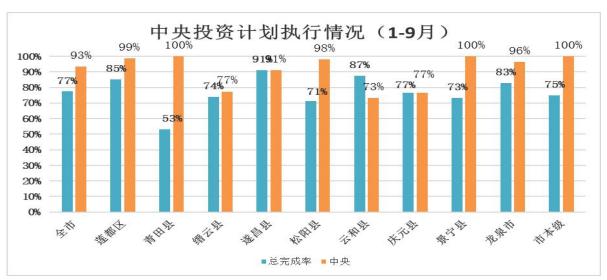

丽水市 2021 年 1-9 月中央投资项目计划完成情况表


单位: 万元

							单位:	力兀
			2资	完成		完成率		
	项目名称	总投资	中央投资	总投资	完成 中央	总完 成率	中央	备注
	合计	64798	17801	53286	16618	82%	93%	
莲都区		2136	1136	2120	1120	99%	99%	
	丽水市莲都区宣平溪流域综合治理工程	2050	1050	1750	1050	100%	100%	
	2021 年莲都区农业水价综合改革	70	70	70	70	100%	100%	
	2021 年水电增效扩容项目	16	16	0	0	0%	0%	本月新増
青田县		196	60	196	60	100%	100%	
	青田县 2021 年农业水价综合改革	196	60	196	60	100%	100%	
缙云县		554	401	410	310	74%	77%	
	缙云县大力塘水库除险加固工程	290	290	240	240	83%	83%	
	2021年缙云县农业水价综合改革	223	70	170	70	76%	100%	
	2021 年农村水电站"十三五"增效扩容改造项目 奖补资金	41	41	0	0	0%	0%	本月新増
遂昌县		4120	1890	3750	1720	91%	91%	
	遂昌县中小流域综合治理项目	4000	1770	3680	1650	92%	93%	
	遂昌县 2021 年农业水价综合改革项目	70	70	70	70	100%	100%	
	2021 年遂昌县农村水电增效扩容改造	50	50	0	0	0%	0%	本月新増
松阳县		10117	5197	7210	5090	71%	98%	
	2021 年松阳县小港综合治理工程	2000	1000	1500	1000	75%	100%	
	2021 年松阳县中小流域治理	1200	730	975	730	81%	100%	
	2021 年松阳县古市镇象鼻头水库除险加固工程	36	35	32	32	89%	91%	
	2021 年松阳县古市镇谢树寮水库除险加固工程	213	205	150	142	70%	69%	
	2021 年松阳县望松街道坑后水库除险加固工程	156	150	156	150	100%	100%	
	2021 年松阳县度枫坪乡重点山洪沟治理工程	1019	700	680	680	67%	97%	
	2021 年松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	4500	2016	3000	2016	67%	100%	
	2021 年松阳县农村水电增效扩容改造项目	11	11	0	0	0%	0%	本月 新増
	2021 年松阳县安民溪小流域水土流失治理工程	912	280	657	280	72%	100%	
	2021 年松阳县农业水价综合改革项目	70	70	60	60	86%	86%	
云和县		7380	1870	6450	1370	87%	73%	
	2021 年安溪流域综合治理工程	1100	400	1100	400	100%	100%	
	2021年云和县浮云溪流域综合治理工程(将军桥 至三望栏、云章、云章下游段)	4870	690	4870	690	100%	100%	

	2021 年云坛溪流域综合治理工程	1030	400	200	0	19%	0%	
			400					
	2021 年云和县水资源节约与保护	320	320	220	220	69%	69%	
	2021年云和县农业水价综合改革	60	60	60	60	100%	100%	
庆元县		1030	1030	790	790	77%	77%	
	2021 年庆元县竹口溪流域综合治理工程	950	950	750	750	79%	79%	
	2021 庆元县农业水价综合改革	80	80	40	40	50%	50%	
景宁县		29860	4448	23960	4448	80%	100%	
	景宁县 2021 年水系连通及农村水系综合整治试 点县	29800	4388	23900	4388	80%	100%	
	景宁县 2021 年农业水价改革	60	60	60	60	100%	100%	
龙泉市		9165	1609	8220	1550	90%	96%	
	龙泉市梅溪、八都溪流域综合治理工程	8500	1280	7890	1280	93%	100%	
	龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目	280	190	190	190	68%	100%	
	龙泉市 2021 年农业水价综合改革项目	326	80	140	80	43%	100%	
	龙泉市 2021 年水电增效扩容项目	59	59	0	0	0%	0%	本月 新増
市本级		240	160	180	160	75%	100%	
	丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目	240	160	180	160	75%	100%	

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修 复工程(水利)计划执行情况

2021年瓯江源头山水林 田湖草沙一体化保护与修复 工程(水利)共有19个项目。 2021年计划总投资6.80亿元,其中中央资金2.09亿元。 其中产产数量四期人。 其中莲都区碧湖平原水系。 大溪治理上程(一期)、丽水市 大溪治理提升改造工程、丽水 市生物栖息繁衍廊道(堰坝)

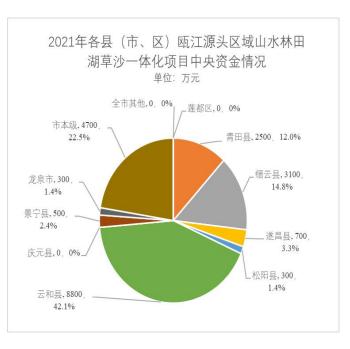

生态化改造 2021 年度投资计划为 0, 主要开展项目前期工作。

截止9月底,完成投资4.57亿元,完成率67.3%;其中完成中央资金0.49亿元,完成率23.4%。从完成率看,投资总额完成率全市松阳县、景宁县、青田县、云和县达到时序要求;由于中央资金8月下达,目前中央资金完成率全市仅松阳县、市本级、景宁县过半。

丽水市 2021 年 1-9 月山水林田湖草沙一体化项目(水利)计划完成情况

单位: 万元

		2021年 投			1-9 月完		尼成投资		
	工程名称	总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率		
	合 计	67967	20900	45744	67.3%	4900	23.4%		
莲都区		0	0	0	/	0	/		
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程 (一期)	0	0	0	/	0	/		
青田县		9340	2500	7280	77.9%	0	0.0%		
	青田县环太鹤湖生态修复工程	7000	2500	5670	81.0%	0	0.0%		
	青田县水电生态化改造	340	0	20	5.9%	0	/		
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理 工程(二期)	2000	0	1590	79.5%	0	/		
缙云县		10600	3100	6300	59.4%	0	0.0%		
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升 工程	7600	2600	5200	68.4%	0	0.0%		
	潜明水库水源保护及生态修复工程	1000	500	0	0.0%	0	0.0%		
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理-	2000	0	1100	55.0%	0	/		
	壶镇至仙都段河道综合治理工程	1000	7 00	- 00	20.00/		0.00/		
遂昌县	公日日1V阳远之比60人7V田七41(和)	1800	700	700	38.9%	0	0.0%		
LA Mrt El	遂昌县松阴溪流域综合治理工程(一期)	1800	700	700	38.9%	0	0.0%		
松阳县	LAMATAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	797	300	797	100.0%	300	100.0%		
- 4u Fl	松阳县松阴溪流域水生态保护修复项目(一期)	797	300	797	100.0%	300	100.0%		
云和县	云和县龙泉溪治理二期工程	21500	8800	16600	77.2%	1300	14.8%		
	云和岳龙永溪市垤—坳上住 云和县浮云溪流域综合治理工程	5000 16500	2000 6800	4500 12100	90.0% 73.3%	300 1000	15.0% 14.7%		
 庆元县	△ 本 会 方 ム 侯 加 域 添 口 加 坐 上 住	200	0	0	0.0%	0	/		
<u> </u>	庆元县毛 垟 溪流域综合治理工程	200	0	0	0.0%	0	/		
 景宁县	<u> </u>	2000	500	1700	85.0%	300	60.0%		
<u> </u>	景宁县小溪流域综合治理工程一期	2000	500	1700	85.0%	300	60.0%		
龙泉市	X 1 2 1 00000000 10 11 11 11 11 11	1730	300	0	0.0%	0	0.0%		
) H M E II	龙泉市大贵溪流域综合治理工程	550	0	0	0.0%	0	/		
	龙泉市道太溪流域综合治理工程	400	0	0	0.0%	0			
	龙泉市安仁溪流域综合治理工程	780	300	0	0.0%	0	0.0%		
市本级		20000	4700	12367	61.8%	3000	63.8%		
~-	丽水市防灾减灾生态调水工程	20000	4700	12367	61.8%	3000	63.8%		
	丽水市大溪治理提升改造工程	0	0	0	/	0	/		
全市其他		0	0	0	/	0	/		
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	0	0	0	/	0	/		

送: 各县(市、区)人民政府、水利局,局领导,局有关处室、局属各 单位。

签发: 张映辉

核稿: 汪小阳

编辑:徐彬

丽水市水利局

2021年10月15日印发
