

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2022 年第 7 期，总第 52 期）

丽水市水利局办公室编

2022-8-8

2022 年 1-7 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况


2022 年，全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-7 月完成投资 28.18 亿元，占年度计划的 56.4%，差时序要求 1.9 个百分点。


从完成率看，莲都区、景宁县、青田县、遂昌县、缙云县均达到时序要求，其中莲都区完成率最高，已达到 82.6%，云和县完成率最低，仅 36.1%。从投资量看，缙云县和青田县完成投资量最大，分别为 5.77 亿元和 4.13 亿元，占全市总投资量的 20.5% 和 14.7%；云和县、莲都区和龙泉市完成投资量较低，都在 2 亿元以下。

丽水市 2022 年度水利建设投资进度表（1-7 月）

单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	2.78	38.6%
莲都区	1.4	1.16	82.6%
龙泉市	3.2	1.50	46.9%
青田县	5.8	4.13	71.3%
云和县	3.4	1.23	36.1%
庆元县	6.6	2.49	37.7%
缙云县	8.3	5.77	69.5%
遂昌县	4.3	3.02	70.2%
松阳县	6.1	3.42	56.1%
景宁县	3.6	2.69	74.7%
合 计	50	28.18	56.4%

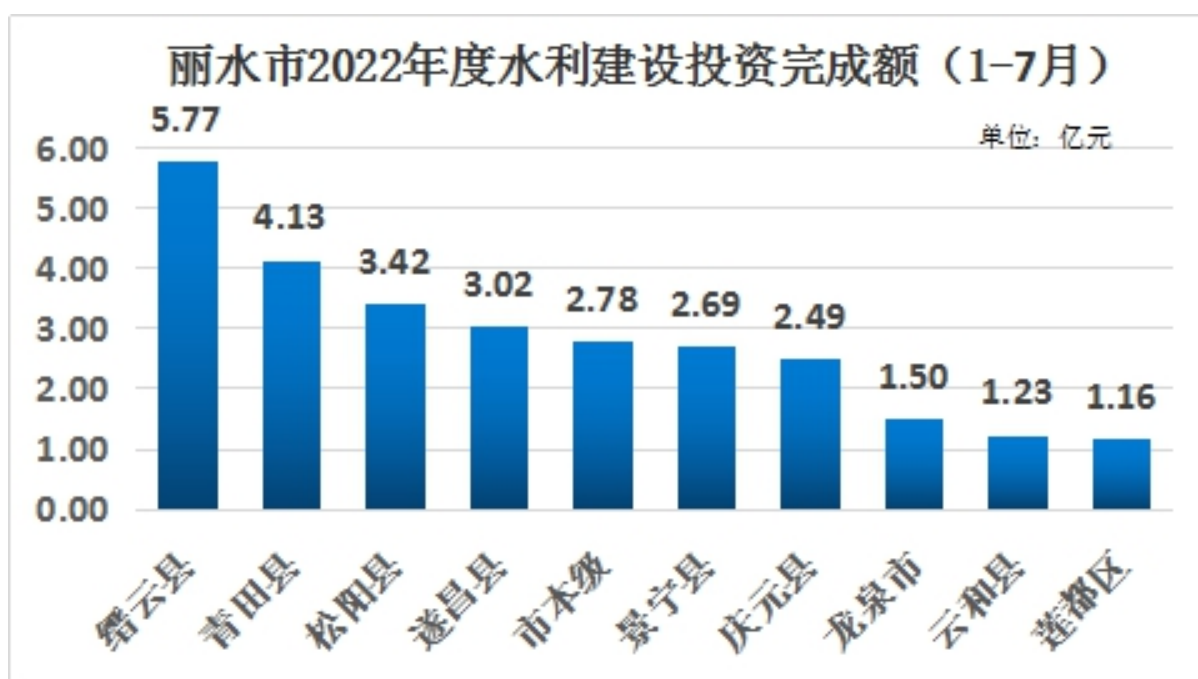

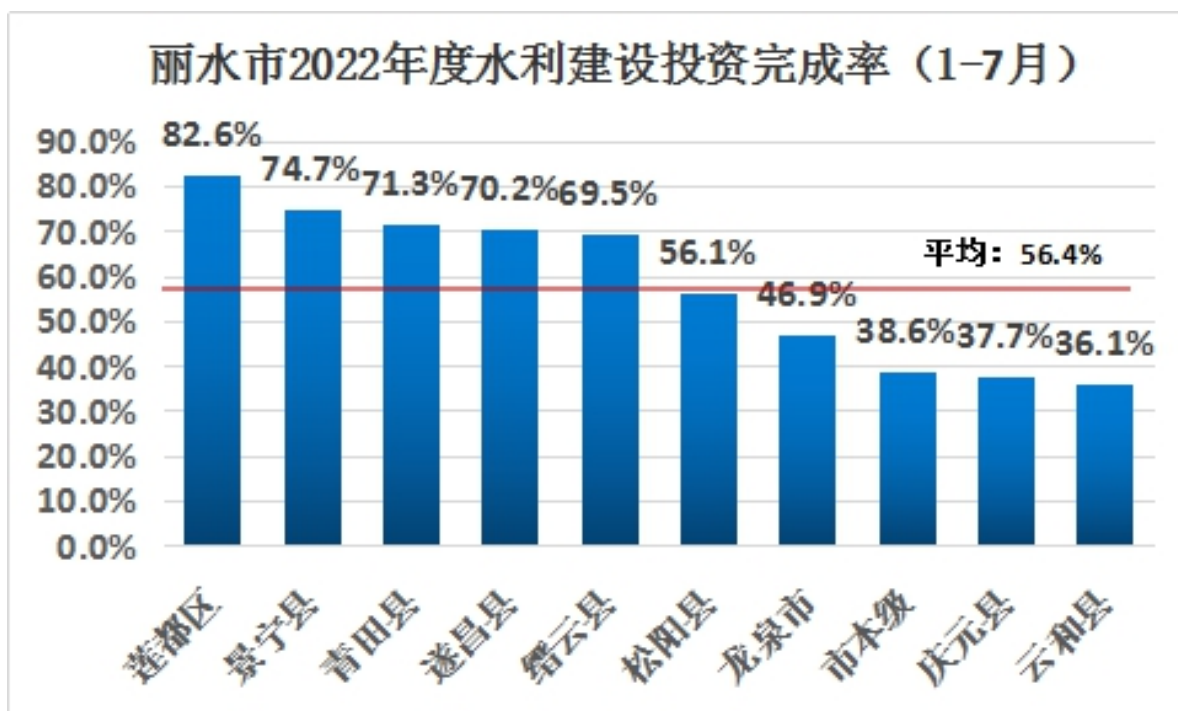

二、水利重大项目计划执行情况

2022年，全市计划投资30.3亿元，共开展22个重大水利建设项目，7月完成投资15.6亿元，占年度计划的51.6%，与时序相差约6.7个百分点，各项目基本按原计划实施。

今年新开工6项，其中列入省级新开工的4项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松阳县松古平原水系综合治理工程已于一季度开工建设；青田县中部、西部引水工程于6月25日开工建设；大溪治理提升改造工程预计三季度开工，年度完成3亿元投资量难度很大；云和县浮云流域综合治理工程（崇头段、城区段）预计9月底开工，年度完成1亿元投资量难度很大。此外，庆元县杨楼溪水库及供水工程和湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程力争年底开工，但难度很大。

丽水市 2022 年 1-7 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022 年投资计划	完成投资额	完成率
合计			1815395	302995	156337	51.6%
1	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	2900	9.67%
2		丽水市滩坑引水工程	70505	15000	8765	58.43%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	10000	13212	132.12%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	3200	64.00%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	4416	88.32%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	4800	68.57%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	13640	34.10%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	700	35.00%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	39	0.39%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	3400	79.07%
11	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	40000	7000	17.50%
12		庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	4000	100.00%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	0	0	/
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	32520	65.04%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	9618	64.12%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1000	1000	100.00%
17		湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	57000	1000	0	0.00%
18	松阳县	松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流）	25054	1000	800	80.00%
19		松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	20500	58.57%
20	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2695	1890	70.13%
21		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	4270	71.17%
22		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	19667	103.51%

2022年，全市开展12个重大水利项目前期工作（其中5个为省重大前期）。7月，莲湖水库开展征地移民实物调查大纲，此外，龙泉市均溪三级水库改建工程、棠溪水库等多个项目开展规模论证。

丽水市2022年1-7月水利重大前期工作进度表


单位：万元

序号	工程名称	总投资	年度任务	目前进展
1	莲湖水库*	790000	完成可研编制	规模论证已通过省厅审查，并已修改完善，待省厅下发审查意见；征地移民实物调查大纲已完成征求意见，准备上报评审。
2	浙西南两库连通工程	500000	完成项建编制	开展项建编制
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	可研编制
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	完成龙泉市本级建设征地实物调查工作大纲征求意见，开展可研编制及文物调查工作
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	完成规模论证初稿修改完善
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	已完成棠溪水库规模论证、上坝道路专项方案编制，实物调查大纲编制及审查已完成，省政府通告令审批中。
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成可研审查	项目建议书已受理，规模论证、可研编制中
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	水资源论证和社会风险评估招标公告中
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	项目建议书招标公告已发布
10	浮云溪流域综合治理工程(崇头段、城区段)	10000	项目开工建设	完成初设评审表，正在报批中
11	景宁县千峡湖库尾消落带生态修复及综合治理工程	250000	完成可研编制	完成可研编制报告
12	庆元县杨楼溪水库	50982	争取完成优化批准	进行方案优化


注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）17020万元，主要实施中小河流治理、中型灌区续建配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革等项目。

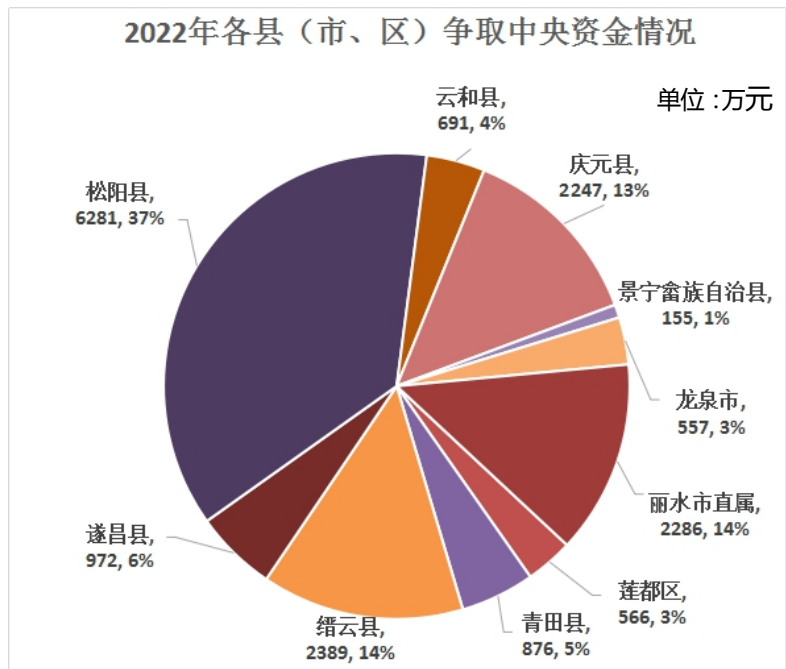

截止7月底，35个项目共完成投资26172.5万元，其中完成中央投资12068.5万元，地方投资14104万元，完成率分别为70.9%和66.6%。13个项目未达到实现要求，其中2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目、2022年河长制湖长制管理中央投资完成率为0。

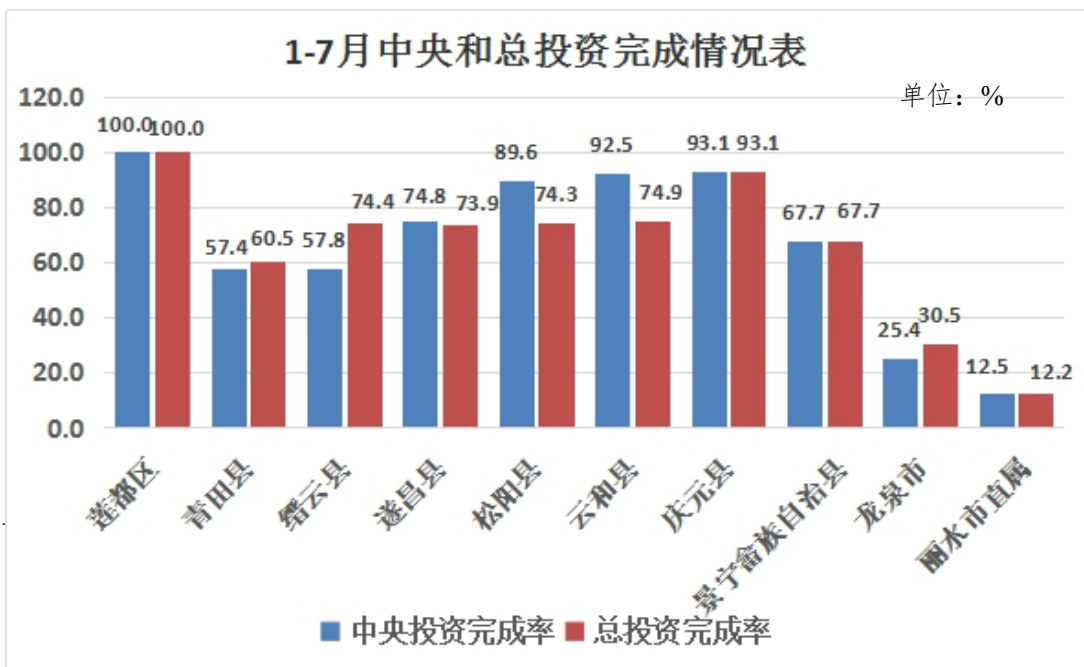

丽水市 2022 年 1-7 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总 计	17020.0	38190.56	12068.5	26172.5	70.9%	68.5%
莲都区		566.0	1063	566.0	1063.0	100.0%	100.0%
	2022 年莲都区宣平流域综合治理工程	368.0	865	368.0	865.0	100.0%	100.0%
	莲都区 2022 年小型水库工程设施维修养护	124.0	124	124.0	124.0	100.0%	100.0%
	2022 年莲都区农业水价综合改革	74.0	74	74.0	74.0	100.0%	100.0%
青田县		876.0	1505	503.0	910.0	57.4%	60.5%
	青田县东坑水库水源工程	701.0	1128	350.0	580.0	49.9%	51.4%
	2022 年青田县小型水库工程设施维修养护	107.0	139	85.0	112.0	79.4%	80.6%
	青田县 2022 年农业水价综合改革	68.0	238	68.0	218.0	100.0%	91.6%
缙云县		2389.0	5889	1380.0	4380.0	57.8%	74.4%
	缙云县陈坑水库及配套水资源综合提升工程	2155.0	5655	1210.0	4210.0	56.1%	74.4%
	缙云县 2022 年小型水库工程设施维修养护	164.0	164	120.0	120.0	73.2%	73.2%
	农业水价综合改革	70.0	70	50.0	50.0	71.4%	71.4%
遂昌县		972.0	7495	727.0	5538.0	74.8%	73.9%
	遂昌县 2022 年中小流域综合治理项目	89.0	6000	89.0	4409.0	100.0%	73.5%
	遂昌县龙井坑水库工程	719.0	1000	500.0	781.0	69.5%	78.1%
	遂昌县 2022 年小型水库工程设施维修养护工程	96.0	137	70.0	100.0	72.9%	73.0%
	遂昌县 2022 年农业水价综合改革项目	68.0	358	68.0	248.0	100.0%	69.3%
松阳县		6281.0	11435	5629.0	8501.0	89.6%	74.3%
	2022 年度松阳县松古平原水系综合治理	350.0	700	350.0	700.0	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600.0	800	600.0	738.0	100.0%	92.3%
	2022 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383.0	4583	2250.0	3500.0	94.4%	76.4%
	2022 年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766.0	4150	1766.0	2900.0	100.0%	69.9%
	2022 年度松阳县周坑水库	994.0	994	550.0	550.0	55.3%	55.3%
	2022 年度松阳县小型水库维修养护工程	117.0	137	58.0	58.0	49.6%	42.3%
	2022 年度松阳县农业水价综合改革项目	71.0	71	55.0	55.0	77.5%	77.5%

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		691.0	3391	639.0	2539.0	92.5%	74.9%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139.0	1639	139.0	1339.0	100.0%	81.7%
	2022年云和县云坛河流域综合治理工程	400.0	1600	400.0	1100.0	100.0%	68.8%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91.0	91	70.0	70.0	76.9%	76.9%
	2022年农业水价改革	61.0	61	30.0	30.0	49.2%	49.2%
庆元县		2247.0	2247	2092.0	2092.0	93.1%	93.1%
	2022年庆元县松源流域综合治理工程	1887.0	1887	1887.0	1887.0	100.0%	100.0%
	2022年庆元县节水型社会	190.0	190	100.0	100.0	52.6%	52.6%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90.0	90	55.0	55.0	61.1%	61.1%
	2022年农业水价综合改革	80.0	80	50.0	50.0	62.5%	62.5%
景宁畲族自治县		155.0	155	105.0	105.0	67.7%	67.7%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91.0	91	60.0	60.0	65.9%	65.9%
	景宁县2022年农业水价改革	64.0	64	45.0	45.0	70.3%	70.3%
龙泉市		557.0	2363.8	141.5	721.5	25.4%	30.5%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379.0	1673.3	0.0	180.0	0.0%	10.8%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95.0	95	58.5	58.5	61.6%	61.6%
	2022年龙泉市农业水价综合改革项目	83.0	595.5	83.0	483.0	100.0%	81.1%
丽水市直属		2286.0	2646.76	286.0	323.0	12.5%	12.2%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286.0	646.76	286.0	323.0	100.0%	49.9%
	2022年河长制湖长制管理	2000.0	2000	0.0	0.0	0.0%	0.0%


四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.24亿元，其中中央资金6亿元。

1-7月，完成投资6.28亿元：其

中完成中央资金1.59亿元，完成地方资金4.69亿元，完成率分别为26.5%和64.8%，总体进展较慢，除江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程、龙泉市大贵河流域综合治理工程、龙泉市安仁河流域综合治理工程中央完成率达到时序要求外，其余项目均低于58.3%。龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、四都流域农田生态修复和提升工程、云和县浮云溪流域综合治理工程、庆元县毛垟溪流域综合治理工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造，仍处于项目前期。

2022年各县（市、区）瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化项目中央资金情况

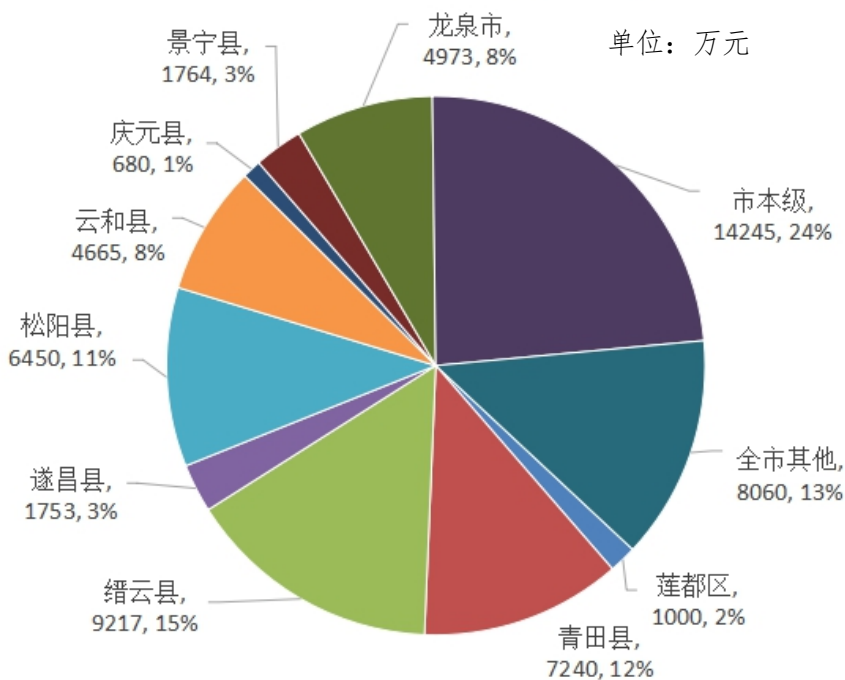

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022年计划投资		1-7月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	132444	60047	62837	47.4%	15901	26.5%
莲都区		2000	1000	3200	160.0%	100	10.0%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	3200	160.0%	100	10.0%
青田县		13760	7240	6070	44.1%	3060	42.3%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	3500	38.9%	2000	40.1%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	970	55.1%	380	36.1%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	1600	53.3%	680	56.7%
缙云县		22958	9217	15080	65.7%	4835	52.5%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	20	12.5%	0	0.0%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	1060	26.5%	335	15.5%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	14000	74.5%	4500	65.2%
遂昌县		3500	1753	1650	47.1%	500	28.6%
	遂昌县松阴河流域综合治理工程（一期）	3500	1753	1650	47.1%	500	28.6%
松阳县		13760	6450	7041	51.2%	1381	21.4%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	3931	64.9%	1381	42.9%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	3110	40.4%	0	0.0%
云和县		10017	4665	3939	39.3%	2400	51.5%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	3400	56.5%	2400	54.8%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	539	13.5%	0	0.0%
庆元县		1200	680	300	25.0%	100	14.7%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	300	25.0%	100	14.7%
景宁县		4500	1764	4270	94.9%	900	51.0%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	4270	94.9%	900	51.0%

分类	工程名称	2022 年计划投资		1-7 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	4475	44.2%	2625	52.8%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	2480	1435	1570	63.3%	1105	77.0%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	1643	1206	1040	63.3%	780	64.7%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	2535	1096	1605	63.3%	740	67.5%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	260	9.4%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	0	0.0%	0	0.0%
市本级		41623	14245	16112	38.7%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	13212	79.5%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	2900	11.6%	0	0.0%
其他县		9000	8060	700	7.8%	0	0.0%
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	9000	8060	700	7.8%	0	0.0%

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：周映辰

丽水市水利局

2022 年 8 月 8 日印发
