

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2023 年第 2 期，总第 59 期）

丽水市水利局办公室编

2023-4-10

2023 年 1-3 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况


2023 年，全市计划完成水利建设投资 60 亿元，1-3 月完成投资 12.21 亿元，占年度计划的 20.4%，与时序进度相差 4.6 个百分点。


从完成率看，青田县、遂昌县均超过 25%，达到时序进度，庆元县、龙泉市、景宁县完成率较低。从投资量看，青田县和缙云县完成投资量最大，分别为 2.19 亿元和 2.18 亿元，占全市总投资量的 17.93%和 17.85%；景宁县完成投资量最低，仅 0.36 亿元。

丽水市 2023 年度水利建设投资进度表

单位：亿元

县（市、区）	全年目标		1-3 月完成情况		
	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	完成率（60 亿）
市本级	8.2	8.3	1.44	17.5%	17.3%
莲都区	2.1	2.3	0.54	25.6%	23.3%
龙泉市	2.5	3.2	0.38	15.1%	11.8%
青田县	7.0	8.2	2.19	31.3%	26.7%
云和县	2.7	3.9	0.73	27.0%	18.7%
庆元县	6.0	7.0	1.08	18.0%	15.4%
缙云县	8.0	9.4	2.18	27.3%	23.2%
遂昌县	4.8	5.6	1.49	31.1%	26.7%
松阳县	8.2	8.5	1.83	22.3%	21.5%
景宁县	3.0	3.6	0.36	12.0%	10.0%
合计	52.5	60	12.21	23.3%	20.4%

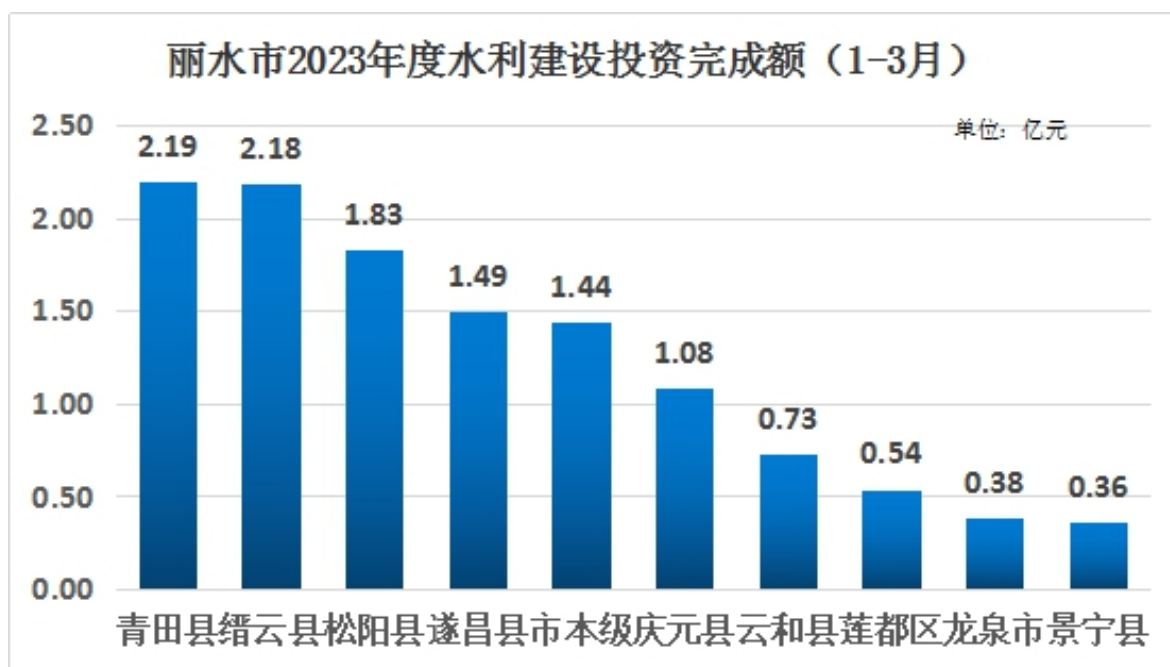

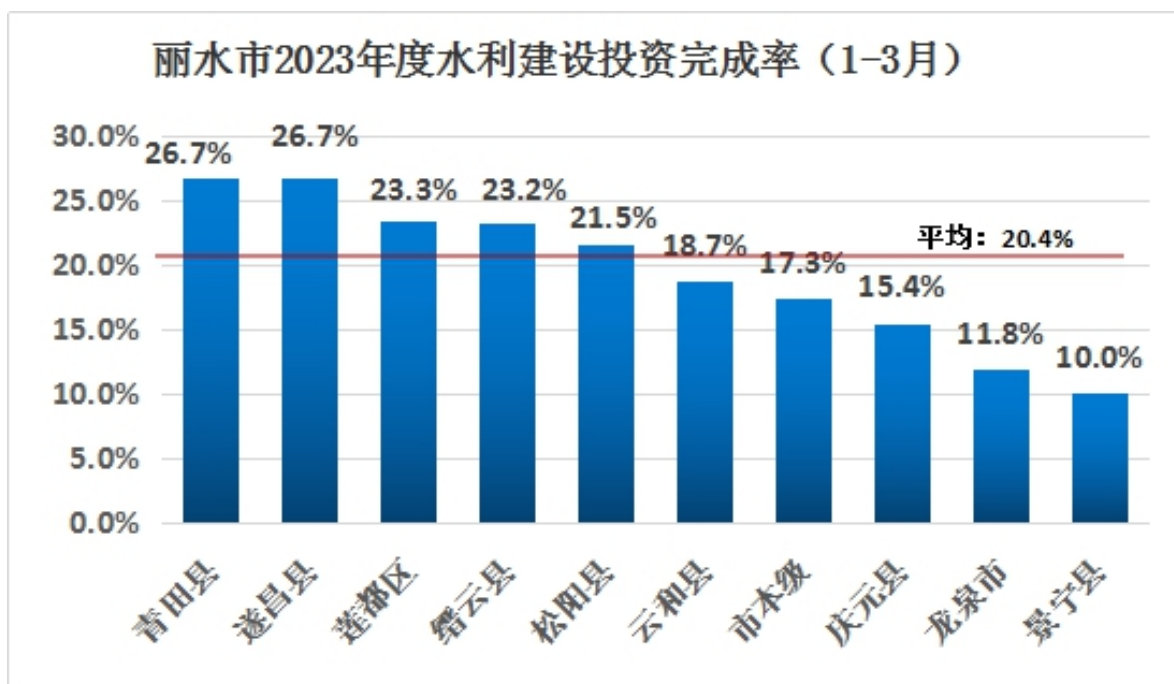

二、水利重大项目计划执行情况

2023年，全市计划投资35.4亿元，共开展32个重大水利建设项目，其中续建项目22个，1-3月完成投资6.71亿元，占年度计划的19.0%，与时序相差约6个百分点，各项目基本按原计划实施。滩坑引水工程、小溪水利枢纽、兰溪桥水库扩建、潜明水库引水等14个项目进度符合预期；8个项目进展滞后，其中，5个项目进度低于20%，分别是大溪治理提升改造工程、云和县龙泉溪治理二期工程、松源河流域综合治理工程、竹垟一级水库及供水工程和清水源水库引水工程。

2023年，新开工10个重大水利建设项目，均计划于下半年开工，其中列入省级新开工的2项，莲湖水库工程和双港水库及供水工程计划今年年底前开工建设。丽水城市内河整治提升工程（一期）和南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）项目前期工作相对滞后。

丽水市 2023 年 1-3 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资 (亿元)	2023 年投资计划			1-3 月完成情况		
				进展要求	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	计划完成率
合计			359	/	248824	353624	67050	26.9%	19.0%
续建			182	/	196824	281624	67050	34.1%	23.8%
1	市本级	滩坑引水工程*	3.7	完工见效	5000	7000	3254	65.1%	46.5%
2		城区排水防涝工程*	7.8	主体工程建设	500	500	500	100.0%	100.0%
3		大溪治理提升改造工程*	4.56	主体工程建设	15000	28000	4600	30.7%	16.4%
4		丽水市南明湖岸线改造工程	8.38	主体工程建设	/	4500	3000	/	66.7%
5		丽水南城防山洪排涝项目 (桐岭溪段)	1.5	完工见效	/	15000	3000	/	20.0%
6	莲都区	碧湖平原水系综合治理工程 (一期)*	7.7	完工见效	5000	5000	1500	30.0%	30.0%
7	龙泉市	梅溪、八都溪、岩樟溪流域 综合治理工程*	4.4	主体工程建设	1200	1200	750	62.5%	62.5%
8		竹垟一级水库及供水工程*	14.6	主体工程建设	5000	10000	1000	20.0%	10.0%
9	青田县	小溪水利枢纽工程*	4.5	主体工程建设	20000	20000	4865	24.3%	24.3%
10		中部、西部引水工程*	7.5	主体工程建设	10000	10000	3350	33.5%	33.5%
11	云和县	浮云溪流域综合治理工程*	0.9	完工见效	5000	5000	1500	30.0%	30.0%
12		云和县龙泉溪治理二期工程 *	7	开工建设	324	324	50	15.4%	15.4%
13		龙泉溪云和段综合治理工程	19.1	主体工程建设	/	1700	2000	/	117.6%
14	庆元县	兰溪桥水库扩建工程*	6.1	主体工程建设	20000	25000	4800	24.0%	19.2%
15		松源溪流域综合治理工程*	5.5	主体工程建设	8000	8000	800	10.0%	10.0%
16	缙云县	潜明水库引水工程*	26.9	主体工程建设	5000	5000	1200	24.0%	24.0%
17		好溪流域综合治理工程*	2.65	主体工程建设	40000	50000	12100	30.3%	24.2%
18	遂昌县	清水源水库引水工程	3.83	主体工程建设	0	10000	600	/	6.0%
19		松阴溪流域综合治理工程 (一期、二期)	28.7	主体工程建设	0	8600	3700	/	43.0%
20	松阳县	松古平原水系综合治理工程 *	5.8	完工见效	50000	60000	12000	24.0%	20.0%
21	景宁县	金村水库及供水工程*	4.2	主体工程建设	800	800	201	25.1%	25.1%
22		小溪流域综合治理工程(一 期)*	4.2	主体工程建设	6000	6000	2280	38.0%	38.0%

序号	区域	项目名称	总投资 (亿元)	2023年投资计划			1-3月完成情况		
				进展要求	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	计划完成率
新建			176.31	/	52000	72000	0	0.0%	0.0%
1	市本级	莲湖水库工程*	72	完成可研审批,开工建设	50000	50000	0	0.0%	0.0%
2		城市内河整治提升工程(一期)	1.8	完成初设审批, I标开工建设	/	4000	0	/	0.0%
3		丽水南城防山洪排涝项目(丽景园段)	5.27	完成初设审批,开工建设	/	5000	0	/	0.0%
4	莲都区	碧湖平原水系综合治理工程(二期、三期)*	11.3	完成可研审批,开工建设	1000	2000	0	0.0%	0.0%
5	龙泉市	龙泉市均溪三级水库改建工程*	9	完成可研批复,开工建设	完成初设批复	/	0	/	/
6	青田县	新八源水库工程*	15	完成可研批复,开工建设	完成可研审批	/	0	/	/
7	缙云县	棠溪水库工程*	24.4	完成初设批复,开工建设	完成可研审批	5000	0	/	0.0%
8	遂昌县	遂昌县成屏二级水库扩建工程*	25.7	完成可研批复,开工建设	完成初设批复	/	0	/	/
9	松阳县	团结水库	2.1	完成初设批复,开工建设	/	1000	0	/	0.0%
10	景宁县	双港水库及供水工程*	10	完成可研审批,一期工程开工建设	1000	5000	0	0.0%	0.0%

注：*为列入省重大项目

2023年，全市开展8个重大水利项目前期工作，各项目进度基本符合计划要求。浙西南两库连通和丽水南城防山洪排涝项目（核心区块）开展前期研究，联城水系综合治理和新处水库已基本完成项建书编制，滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程已完成项目赋码，项建书报省发改委受理，雅溪水库综合利用提升工程正在编制规模论证报告，湖南镇水库综合保护与水生态修复工程（遂昌段）开展可研报审，城市内河整治提升工程（二期）开展初设编制。

丽水市 2023 年水利重大前期工作进度表


序号	县（市、区）	工程名称	总投资（亿元）	2023 年计划		1-3 月完成情况
				省级任务	总体要求	项目进展
1	市本级	浙东引水-浙西南两库连通工程*	50.0	委托开展前期工作	完成项目立项	项建书在编
2	市本级	联城水系综合治理工程	10.0	/	完成初设批复 力争开工	项目建议书完善，开展可研编制
3	市本级	城市内河整治提升工程（二期）	1.8	/	完成初设批复	开展初设编制
4	市本级	丽水南城防山洪排涝项目（核心区块）	4.0	/	完成初设批复	前期研究
5	莲都区	雅溪水库综合利用提升工程*	26.5	可研编制	可研编制	可研编制
6	遂昌县	湖南镇水库综合保护与水生态修复工程（遂昌段）*	4.9	完成可研审批	完成可研审批	可研报审
7	松阳县	新处水库	10	/	完成项目立项	项目建议书编制中
8	景宁县	滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程*	28.4	完成可研审查	完成可研审查	项目已赋码，项目建议书受理中

注：*为列入省重大前期项目

三、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2023年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.17亿元，其中中央资金7.33亿元。

1-3月，完成投资2.48亿元：其中

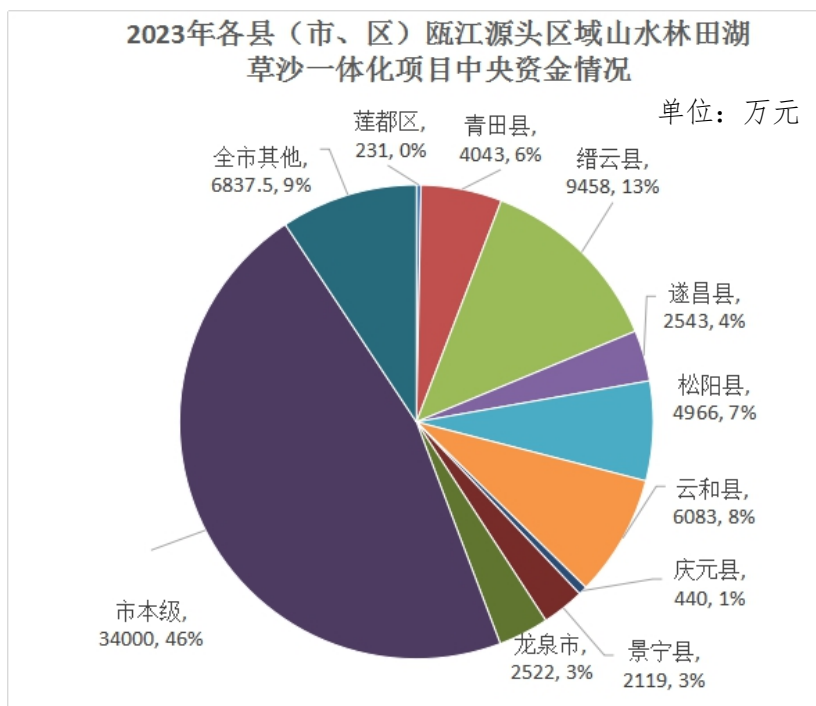

完成中央资金1.10亿元，完成地方资金1.38亿元，完成率分别为15.0%和23.6%，缙云县、龙泉市、市本级、松阳县总体进展较慢。莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）、青田县环太鹤湖生态修复工程、青田县水电生态化改造等15个项目进度符合预期，7个项目进展滞后进度低于20%，分别是龙泉市安仁溪流域综合治理工程、江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程、丽水市大溪治理提升改造工程、四都流域农田生态修复和提升工程、潜明水库水源保护及生态修复工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程；松阳县松阴溪流域水生态保护修复项目（一期）滞后严重，完成率仅6%。

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2023年计划投资		1-3月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	131668.5	73251	24760.9	18.81%	10976	15.0%
莲都区		3000	231	1500	50.00%	231	100%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	3000	231	1500	50.00%	231	100%
青田县		10650	4043	3145	29.5%	1516	37.5%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	3471	2221	24.68%	1068	30.8%
	青田县水电生态化改造	1650	572	924	60.00%	448	78.30%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	0	0	/	/	/	/
缙云县		23539.8	9458	3275.17	13.91%	2575.2	27.2%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	1410	1350	300	21.3%	300	22.2%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4231.6	1436	300	7.1%	200	13.9%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	17898.3	6672	2675.2	14.9%	2075.2	31.1%
遂昌县		4450	2543	1200	27.6%	640	25.2%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	4450	1843	1200	27.6%	640	25.2%
松阳县		16277	4966	1240	7.60%	600	12.1%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	4867	1506	240	4.90%	0	0.0%
	四都流域农田生态修复和提升工程	11410	3460	1000	8.8%	600	17.3%
云和县		9183	6800	4319	45.73%	2000	29.4%
	云和县龙泉溪治理二期工程	8233	6800	4200	51.01%	2000	29.4%
	云和县浮云流域综合治理工程	950	0	190	20.00%	0	0.0%
庆元县		1600	440	650	40.63%	330	96.5%
	庆元县毛垟流域综合治理工程	1600	440	650	40.63%	330	96.5%

分类	工程名称	2023 年计划投资		1-3 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
景宁县		2119	2119	700	36.14%	0	0.0%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	2119	2119	700	36.14%	0	0.0%
龙泉市		8519	2522	1364	16.00%	882	35.0%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	1470	537	320	21.77%	320	59.59%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	944	109	220	23.30%	109	100.00%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	1585	357	300	18.93%	100	28.01%
	龙泉市八都流域八都镇下游段综合治理工程	4030	1240	275	6.80%	135	10.80%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	820	279	249	30.37%	218	78.1%
市本级		42513	34000	5095	11.98%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	1113	0	495	44.5%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	41400	34000	4600	11.11%	0	0%
其他县		9652.5	6837.5	2201.75	22.81%	2201.8	32.20%
	丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造	9652.5	6837.5	2201.75	22.81%	2201.75	32.20%

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：罗俊

编辑：周映辰

丽水市水利局

2023 年 4 月 10 日印发
