丽水市水利局简报
（水利建设投资）

（2022 年第 11 期，总第 56 期）

丽水市水利局办公室编　　2022-11-9

2022 年 1-10 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况

2022 年，全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-10 月完成投资 40.57 亿元，占年度计划的 81.1%，差时序要求约 2 个百分点。

从完成率看，青田县、莲都区、缙云县均超额完成年度计划，其中青田县已超过年度计划 6 个百分点，松阳县、遂昌县达到时序要求，市本级完成率最低，仅 55.9%。从投资量看，缙云县和青田县完成投资量最大，分别为 8.40 亿元和 6.17 亿元，占全市总投资量的 20.7%和 15.2%;莲都区完成投资量最低,仅 1.5 亿元。

丽水市2022年度水利建设投资进度表（1-10月）

单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	4.02	55.9%
莲都区	1.4	1.47	105.0%
龙泉市	3.2	2.38	74.3%
青田县	5.8	6.17	106.4%
云和县	3.4	2.12	62.4%
庆元县	6.6	3.80	57.5%
缙云县	8.3	8.40	101.2%
遂昌县	4.3	3.89	90.4%
松阳县	6.1	5.53	90.7%
景宁县	3.6	2.79	77.6%
合 计	50	40.57	81.1%

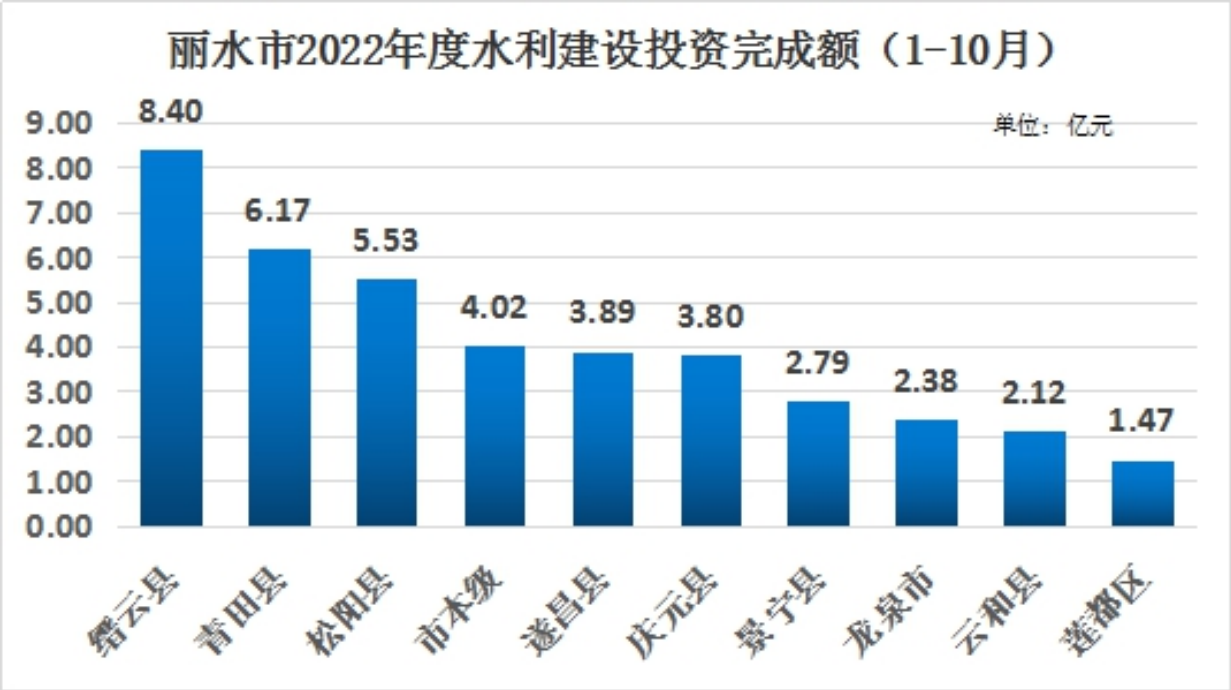

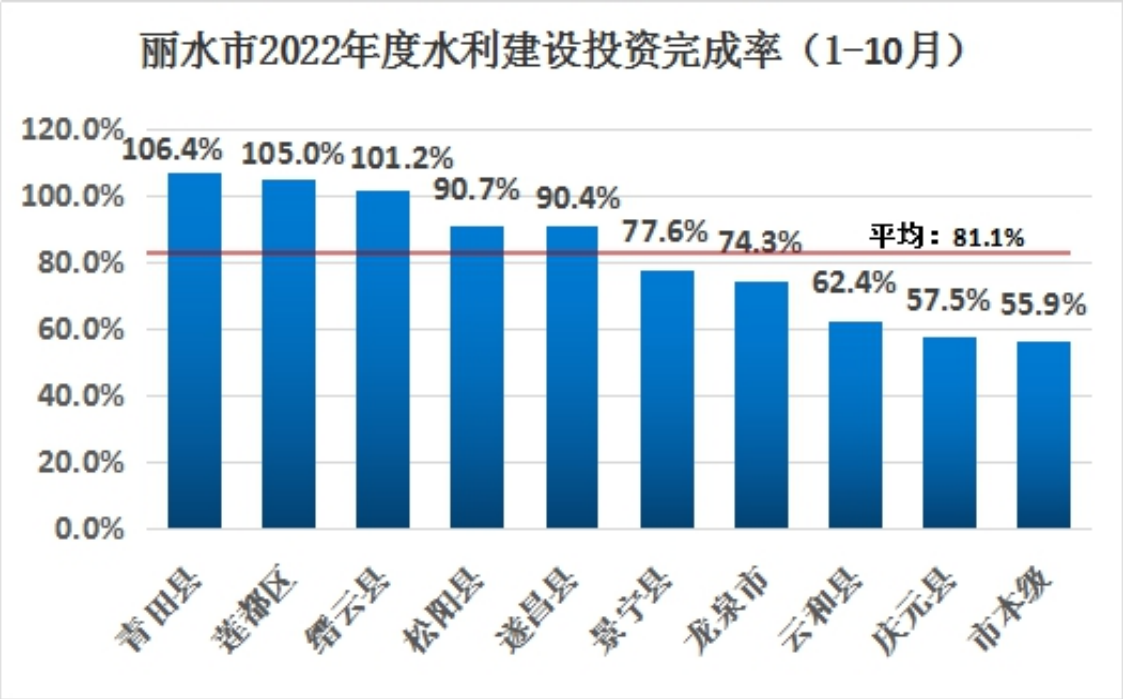

二、水利重大项目计划执行情况

2022 年，全市计划投资 30.3 亿元，共开展 20 个重大水利建设项目，10 月完成投资 22.12 亿元，占年度计划的 73.1%，与时序相差约 10 个百分点,各项目基本按原计划实施。

今年新开工 6 项，其中列入省级新开工的 4 项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松阳县松古平原水系综合治理工程已于一季度开工建设；青田县中部、西部引水工程于 6 月 25 日开工建设；大溪治理提升改造工程Ⅰ标开工建设；工程总承包Ⅱ标已完成招标、合同签订，办理质量手续，施工准备中；工程总承包Ⅲ标发布中标通知书，合同签订中。云和县浮云溪流域综合治理工程仍处于招投标阶段，预计 11 月开工建设；此外，庆元县杨楼溪水库及供水工程因庆元县城供水方案调整，杨楼溪水库不再作为庆元县城主要供水水源，项目暂缓。

丽水市2022年1-10月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022年投资计划	完成投资额	完成率
合 计			**1733341**	**302600**	**221183**	**73.09%**
1	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	8400	28.00%
2		丽水市滩坑引水工程	70505	15000	12350	82.33%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	15000	14989	99.93%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	4200	84.00%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	7605	152.10%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	6725	96.07%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	22140	55.35%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	1400	70.00%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	1089	10.89%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	4000	93.02%
11	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	35000	11150	31.86%
12		庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	4805	120.13%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	1000	0	0.00%
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	48820	97.64%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	13733	91.55%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1600	1400	87.50%
17	松阳县	松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	31500	90.00%
18	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2700	1890	70.00%
19		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	5320	88.67%
20		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	19667	103.51%

2022年，全市开展11个重大水利项目前期工作（其中6个为省重大前期）。10月，龙泉均溪三级水库和遂昌成屏二级水库等多个项目开展项目规模论证审查。其中，均溪三级水库改建工程年底完成可研审批难度较大，莲湖水库完成移民大纲审批难度很大。

丽水市2022年1-10月水利重大前期工作进度表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	年度任务	项目进度
1	莲湖水库*	790000	可研审查	省政府已下发停建通告，实物调查准备工作已完成，即将开展现场调查。
2	浙西南两库连通工程	500000	完成项建编制	编制项目建议书
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	完成可研初稿
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	完成规模论证审查会，修改后报批；开展文物调查、用地预审、社会稳定风险评估、地质灾害风险评估工作。
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	完成规模论证初稿。
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	已完成棠溪水库规模论证、上坝道路专项方案编制，实物调查大纲编制及审查已完成，并已进场实物调查，完成省政府通告令审批。
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	出具规模意见	项目建议书已受理，完成规模论证报告，可研编制中
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	水资源论证，社会风险评估报告，节地评价报告编制完成待审查。
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	完成初步方案对接，明确总体规划方案。
10	湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程*	107000	项目开工建设，力争完成提升改造3公里	初设批复完成，正在施工招投标中
11	景宁县千峡湖库尾消落带生态修复及综合治理工程	250000	完成可研编制	编制项目建议书

注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）17020 万元，主要实施中小河流治理、中型灌区续建配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革等项目。

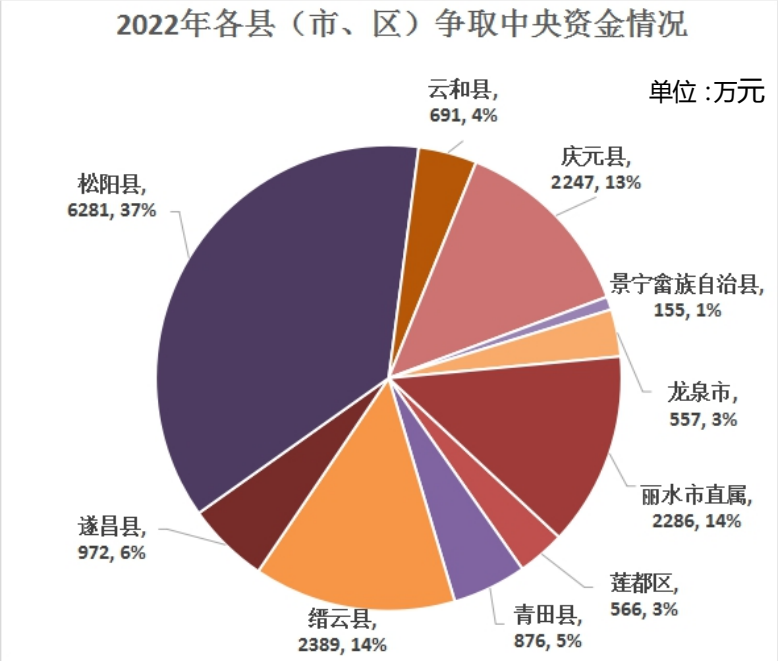

截止 10 月底，36 个项目共完成投资 38117.26 万元，其中完成中央投资 15615 万元，地方投资 22502.26 万元，完成率均为 91.7%。青田县东坑水库水源工程、2022 年河长制湖长制管理的中央资金使用未达到时序要求，下一步要加快项目推进。

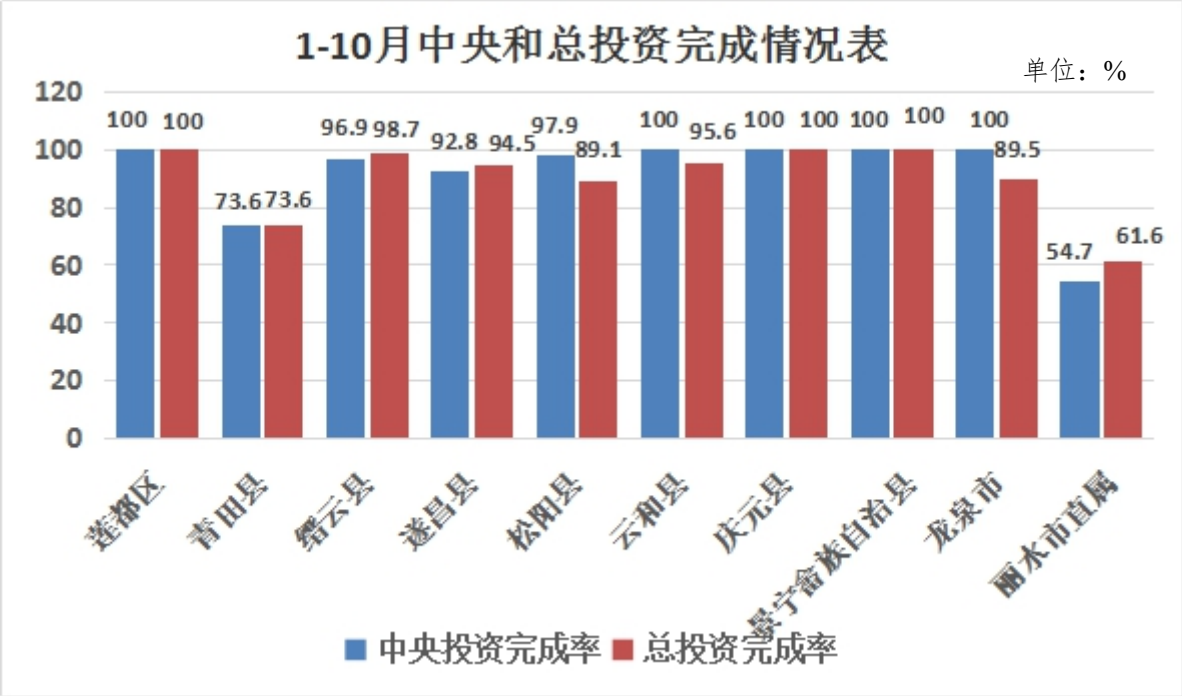

丽水市2022年1-10月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总　计	17020.0	38190.56	15615	38117.3	91.7%	91.7%
莲都区		566.0	1063	566	1063.0	100.0%	100.0%
	2022年莲都区宣平溪流域综合治理工程	368.0	865	368	865.0	100.0%	100.0%
	莲都区2022年小型水库工程设施维修养护	124.0	124	124	124.0	100.0%	100.0%
	2022年莲都区农业水价综合改革	74.0	74	74	74.0	100.0%	100.0%
青田县		876.0	1505	645	1107.0	73.6%	73.6%
	青田县东坑水库水源工程	701.0	1128	470	730	67.0%	64.7%
	2022年青田县小型水库工程设施维修养护	107.0	139	107	139.0	100.0%	100.0%
	青田县2022年农业水价综合改革	68.0	238	68	238.0	100.0%	100.0%
缙云县		2389.0	5889	2314	5814.0	96.9%	98.7%
	缙云县陈坑水库及配套水资源综合提升工程	2155.0	5655	2080	5580.0	96.5%	98.7%
	缙云县2022年小型水库工程设施维修养护	164.0	164	164	164.0	100.0%	100.0%
	农业水价综合改革	70.0	70	70	70.0	100.0%	100.0%
遂昌县		972.0	7495	902	7084.0	92.8%	94.5%
	遂昌县2022年中小流域综合治理项目	89.0	6000	89	5659.0	100.0%	94.3%
	遂昌县龙井坑水库工程	719.0	1000	649	930.0	90.3%	93.0%
	遂昌县2022年小型水库工程设施维修养护工程	96.0	137	96	137.0	100.0%	100.0%
	遂昌县2022年农业水价综合改革项目	68.0	358	68	358.0	100.0%	100.0%
松阳县		6281.0	11435	6152	10186.0	97.9%	89.1%
	2022年度松阳县松古平原水系综合治理	350.0	700	350	700.0	100.0%	100.0%
	2022年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600.0	800	600	800.0	100.0%	100.0%
	2022年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383.0	4583	2350	3950.0	98.6%	86.2%
	2022年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766.0	4150	1766	3650.0	100.0%	88.0%
	2022年度松阳县周坑水库	994.0	994	900	900.0	90.5%	90.5%
	2022年度松阳县小型水库维修养护工程	117.0	137	115	115.0	98.3%	83.9%
	2022年度松阳县农业水价综合改革项目	71.0	71	71	71.0	100.0%	100.0%

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		691	3391	691	3241.0	100.0%	95.6%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139	1639	139	1589.0	100.0%	96.9%
	2022年云和县云坛溪流域综合治理工程	400	1600	400	1500.0	100.0%	93.8%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91	91	91	91.0	100.0%	100.0%
	云和县2022年农业水价改革	61	61	61	61.0	100.0%	100.0%
庆元县		2547	2547	2547	5905.0	100.0%	100.0%
	2022年庆元县松源溪流域综合治理工程	1887	1887	1887	5150.0	100.0%	100.0%
	2022年庆元县节水型社会	190	190	190	285.0	100.0%	100.0%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90	90	90	90.0	100.0%	100.0%
	庆元县2022年农业水价综合改革	80	80	80	80.0	100.0%	100.0%
	2022年庆元县智慧水网建设	300	300	300	300.0	100.0%	100.0%
景宁畲族自治县		155	155	155	155.0	100.0%	100.0%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91	91	91	91.0	100.0%	100.0%
	景宁县2022年农业水价改革	64	64	64	64.0	100.0%	100.0%
龙泉市		557	2363.8	557	2115.5	100.0%	89.5%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379	1673.3	379	1425.0	100.0%	85.2%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95	95	95	95.0	100.0%	100.0%
	2022年龙泉市农业水价综合改革项目	83	595.5	83	595.5	100.0%	100.0%
丽水市直属		1986	2346.76	1086	1446.8	54.7%	61.6%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286	646.76	286	646.8	100.0%	100.0%
	2022年河长制湖长制管理	1700	1700	800	800	47.1%	47.1%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022 年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共 22 个项目，年度总投资 13.24 亿元，其中中央资金 6 亿元。

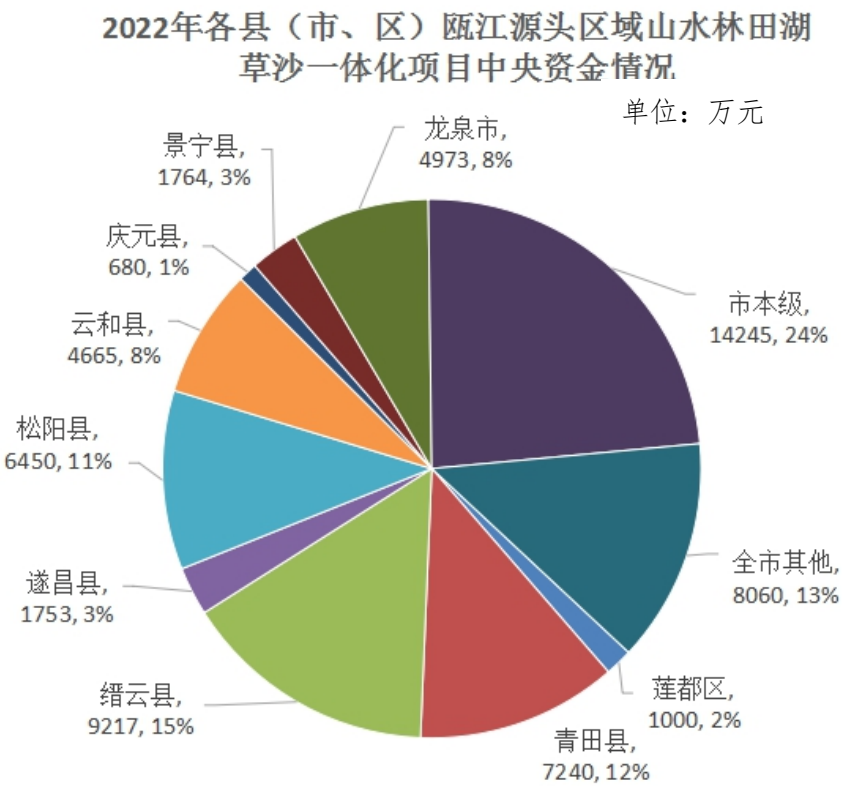

1-10 月，完成投资 9.04 亿元：其中完成中央资金 2.60 亿元，完成地方资金 6.44 亿元，完成率分别为 43.3%和 88.9%，总体进展较慢，除莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）、江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程、景宁县小溪流域综合治理工程一期、龙泉市大贵溪流域综合治理工程、龙泉市安仁溪流域综合治理工程中央投资完成率达到时序要求外，其余项目均低于 83.3%。缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、云和县浮云溪流域综合治理工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造，仍处于项目前期。

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022年计划投资		1-10月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合　计	**132444**	**60047**	**90379**	**68.2%**	**26006**	**43.3%**
莲都区		2000	1000	4200	210.0%	1000	100.0%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	4200	210.0%	1000	100.0%
青田县		13760	7240	10410	75.7%	5100	70.4%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	6880	76.0%	3380	67.8%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	1250	71.0%	610	57.9%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	2280	76.0%	1110	92.5%
缙云县		22958	9217	20380	88.8%	7440	80.7%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	40	25.0%	0	0.0%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	1940	48.5%	940	43.4%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	18400	97.8%	6500	94.2%
遂昌县		3500	1753	2650	75.7%	1250	71.3%
	遂昌县松阴溪流域综合治理工程（一期）	3500	1753	2650	75.7%	1250	71.3%
松阳县		13760	6450	10800	78.5%	2471	38.3%
	松阳县松阴溪流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	5100	84.1%	2271	70.5%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	5700	29.8%	200	6.2%
云和县		10017	4665	5050	50.4%	3000	64.3%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	4000	66.5%	3000	66.2%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	1050	26.3%	0	0.0%
庆元县		1200	680	730	60.8%	530	77.9%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	730	60.8%	530	77.9%
景宁县		4500	1764	5320	118.2%	1480	83.9%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	5320	118.2%	1480	83.9%

分类	工程名称	2022年计划投资		1-10月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	6150	60.7%	3335	67.1%
	龙泉市大贵溪流域综合治理工程	2480	1435	2200	88.7%	1355	95.1%
	龙泉市道太溪流域综合治理工程	1643	1206	1450	88.3%	1000	82.9%
	龙泉市安仁溪流域综合治理工程	2535	1096	2240	88.4%	980	89.4%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	260	9.4%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	0	0.0%	0	0.0%
市本级		41623	14245	23389	56.2%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	14989	90.1%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	8400	33.6%	0	0.0%
其他县		9000	8060	1300	14.4%	400	5.0%
	丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造	9000	8060	1300	14.4%	400	5.0%

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉　　核稿：罗俊　　编辑：周映辰

丽水市水利局　　2022年11月9日印发
